

PONTE JK - ARRANJO ESTRUTURAL ORIGINAL
DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
S/ESCALA

ETAPAS DE EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DA PONTE JK

1ª etapa (20 dias) - execução de serviços preliminares como:

- Instalação da placa obra;
- Fornecimento de tela de nylon para proteção dos usuários durante a obra, das juntas de dilatação em perfil extrudado, do sistema de iluminação para trabalho noturno, das chapas metálicas para servir de assoalho provisório para passagem de veículos durante as obras;
- Remoção de junta de dilatação elastomérica com perfil metálico;
- Instalação de manta impermeabilizante;
- Remanejamento das barreiras de proteção centrais e laterais em concreto armado;
- Sinalização de transito: cavaletes e cones.


2ª etapa (40 dias):

- Limpeza das juntas de dilatação;
- Fornecimento e montagem da junta de dilatação elastomérica com perfil metálico para os Apoios P5B e P7B;
- Manutenção das juntas de dilatação dos apoios P6B e P7B, com instalação de manta impermeabilizante, reaperto e/ou troca de parafusos e limpeza;
- Aplicação de material termoplástico nas faixas de transição.


É importante destacar que os serviços não deverão prejudicar o fluxo de veículos na Ponte JK, por isso deverão ser realizados em período noturno, entre 22h00 e 06h00.

NOTAS :
1-Dimensões em mm (E.A.);
2-Material : chapas USI-SAC 50 (E.A.);
3-Eletrodo: AWS E-7018 G;
4-Concreto fck=30MPa

JUNTA COM PERFIL METÁLICO=FIP/GPE-200

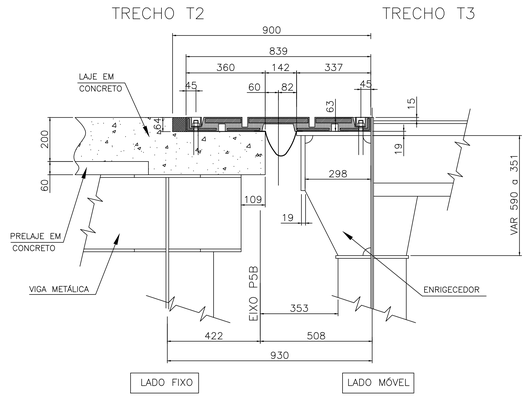


APOIO 5B
ORIGINAL

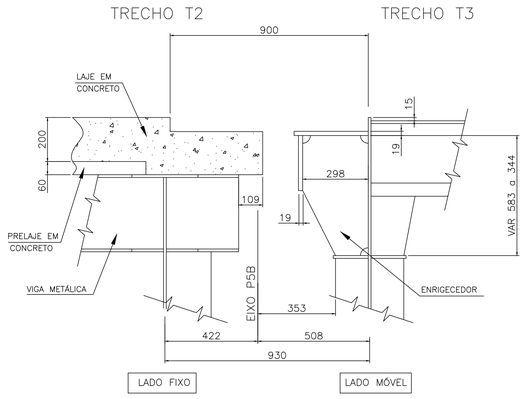

APOIO 5B
PREPARAÇÃO

JUNTA COM PERFIL METÁLICO=AGOM AGFLEXJ 200

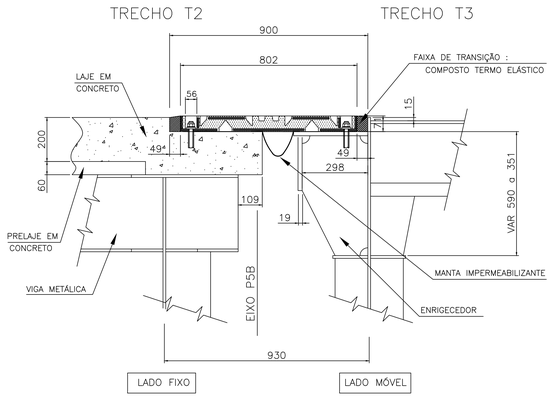

APOIOS 5B (7B)
SUBSTITUIÇÃO

01	VERSÃO INICIAL	29/01/2024	LUIZ SERGIO	LUIZ SERGIO
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL

SETOR: BRASILIA/DF
ENDEREÇO: LIGAÇÃO DA SHIS QL 26 LAGO SUL AO SCES TRECHO 2 - PLANO PILOTO / DF
PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO: LUIZ SERGIO DE SOUSA RRT/ART: 0720240005994

PROPRIETÁRIO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AUTOR DO PROJETO: LUIZ SERGIO DE SOUSA CREA: 60.439/D-MG

RESP. TÉCNICO CREA:

NOVACAP

Nº DO PROJETO: PROJ-DE-006-24

TÍTULO: PROJETO BÁSICO-SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
NOME DO PROJETO: RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DA PONTE JK
CONTEÚDO: DETALHES DA RECOMPOSIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024 | ESCALA: 1:50 | NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-006-24-STR-PB-001-GER-DET-001-R00

SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: STR 001 REV.00
