



SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA - CANTEIRO DE OBRAS
Planta Baixa - FASE 01
ESC: 1/500

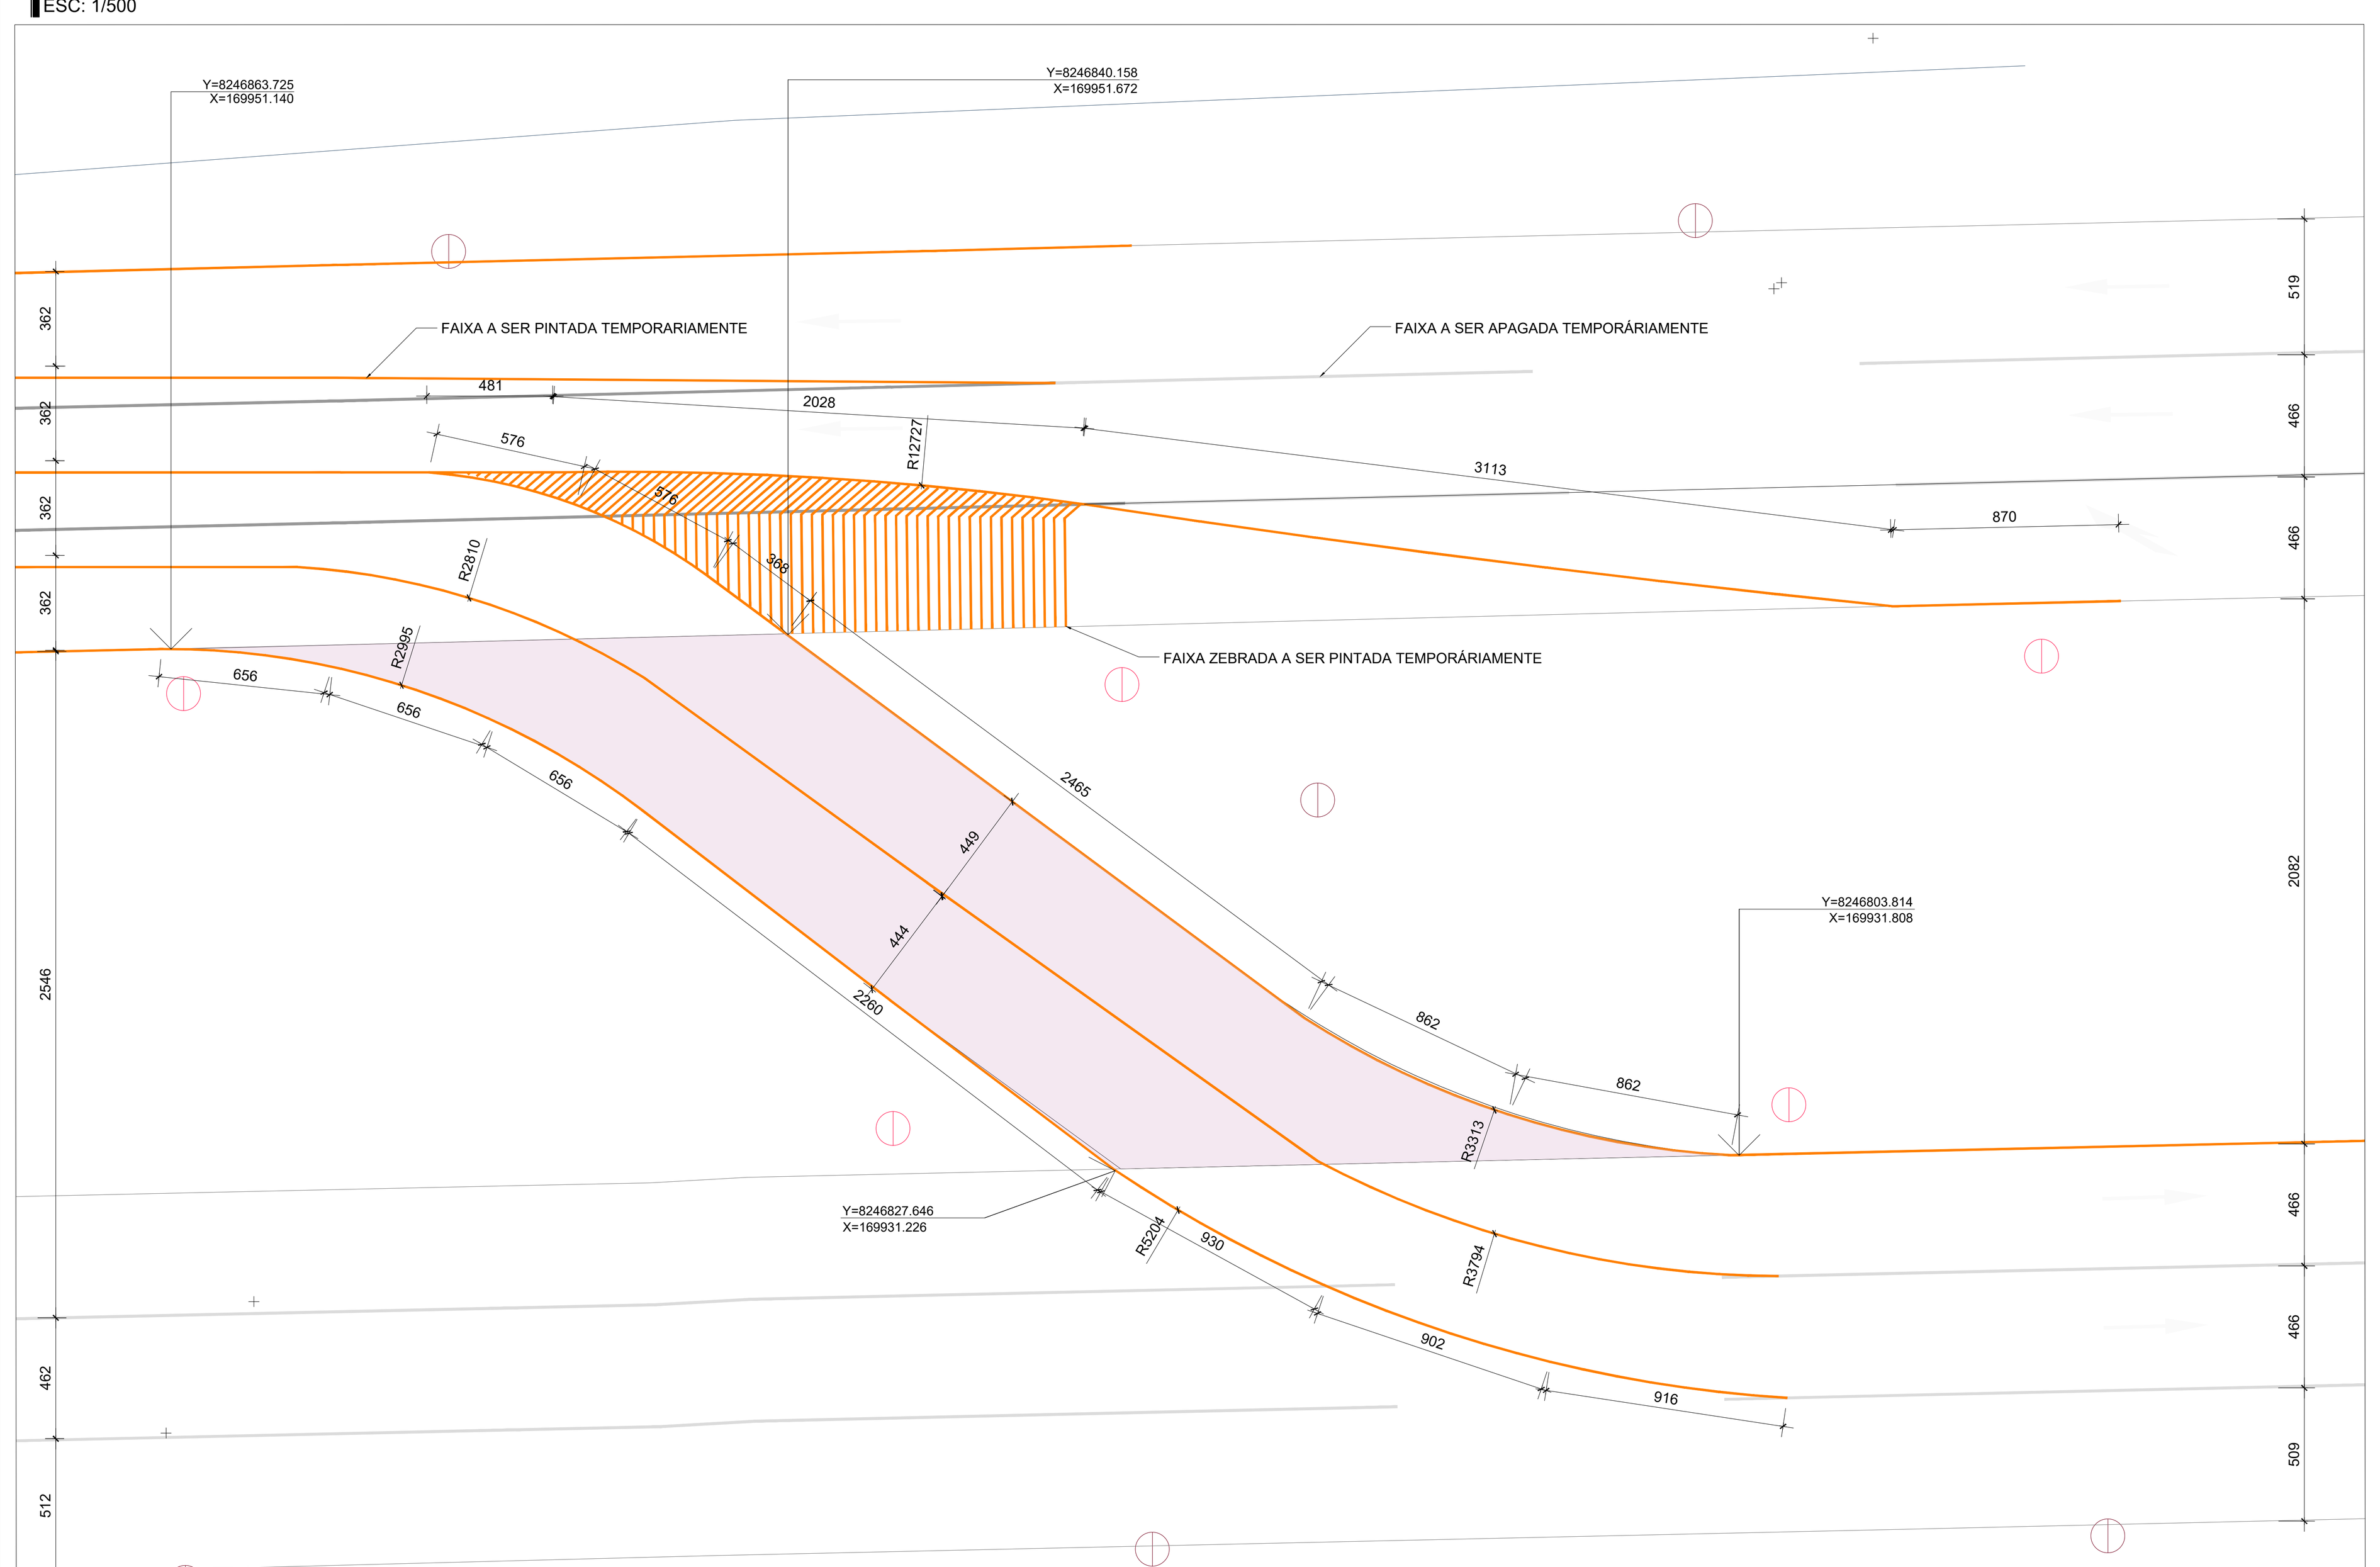

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA - DETALHAMENTO DESVIO 1 FASE 01
FASE 01
SEM ESCALA

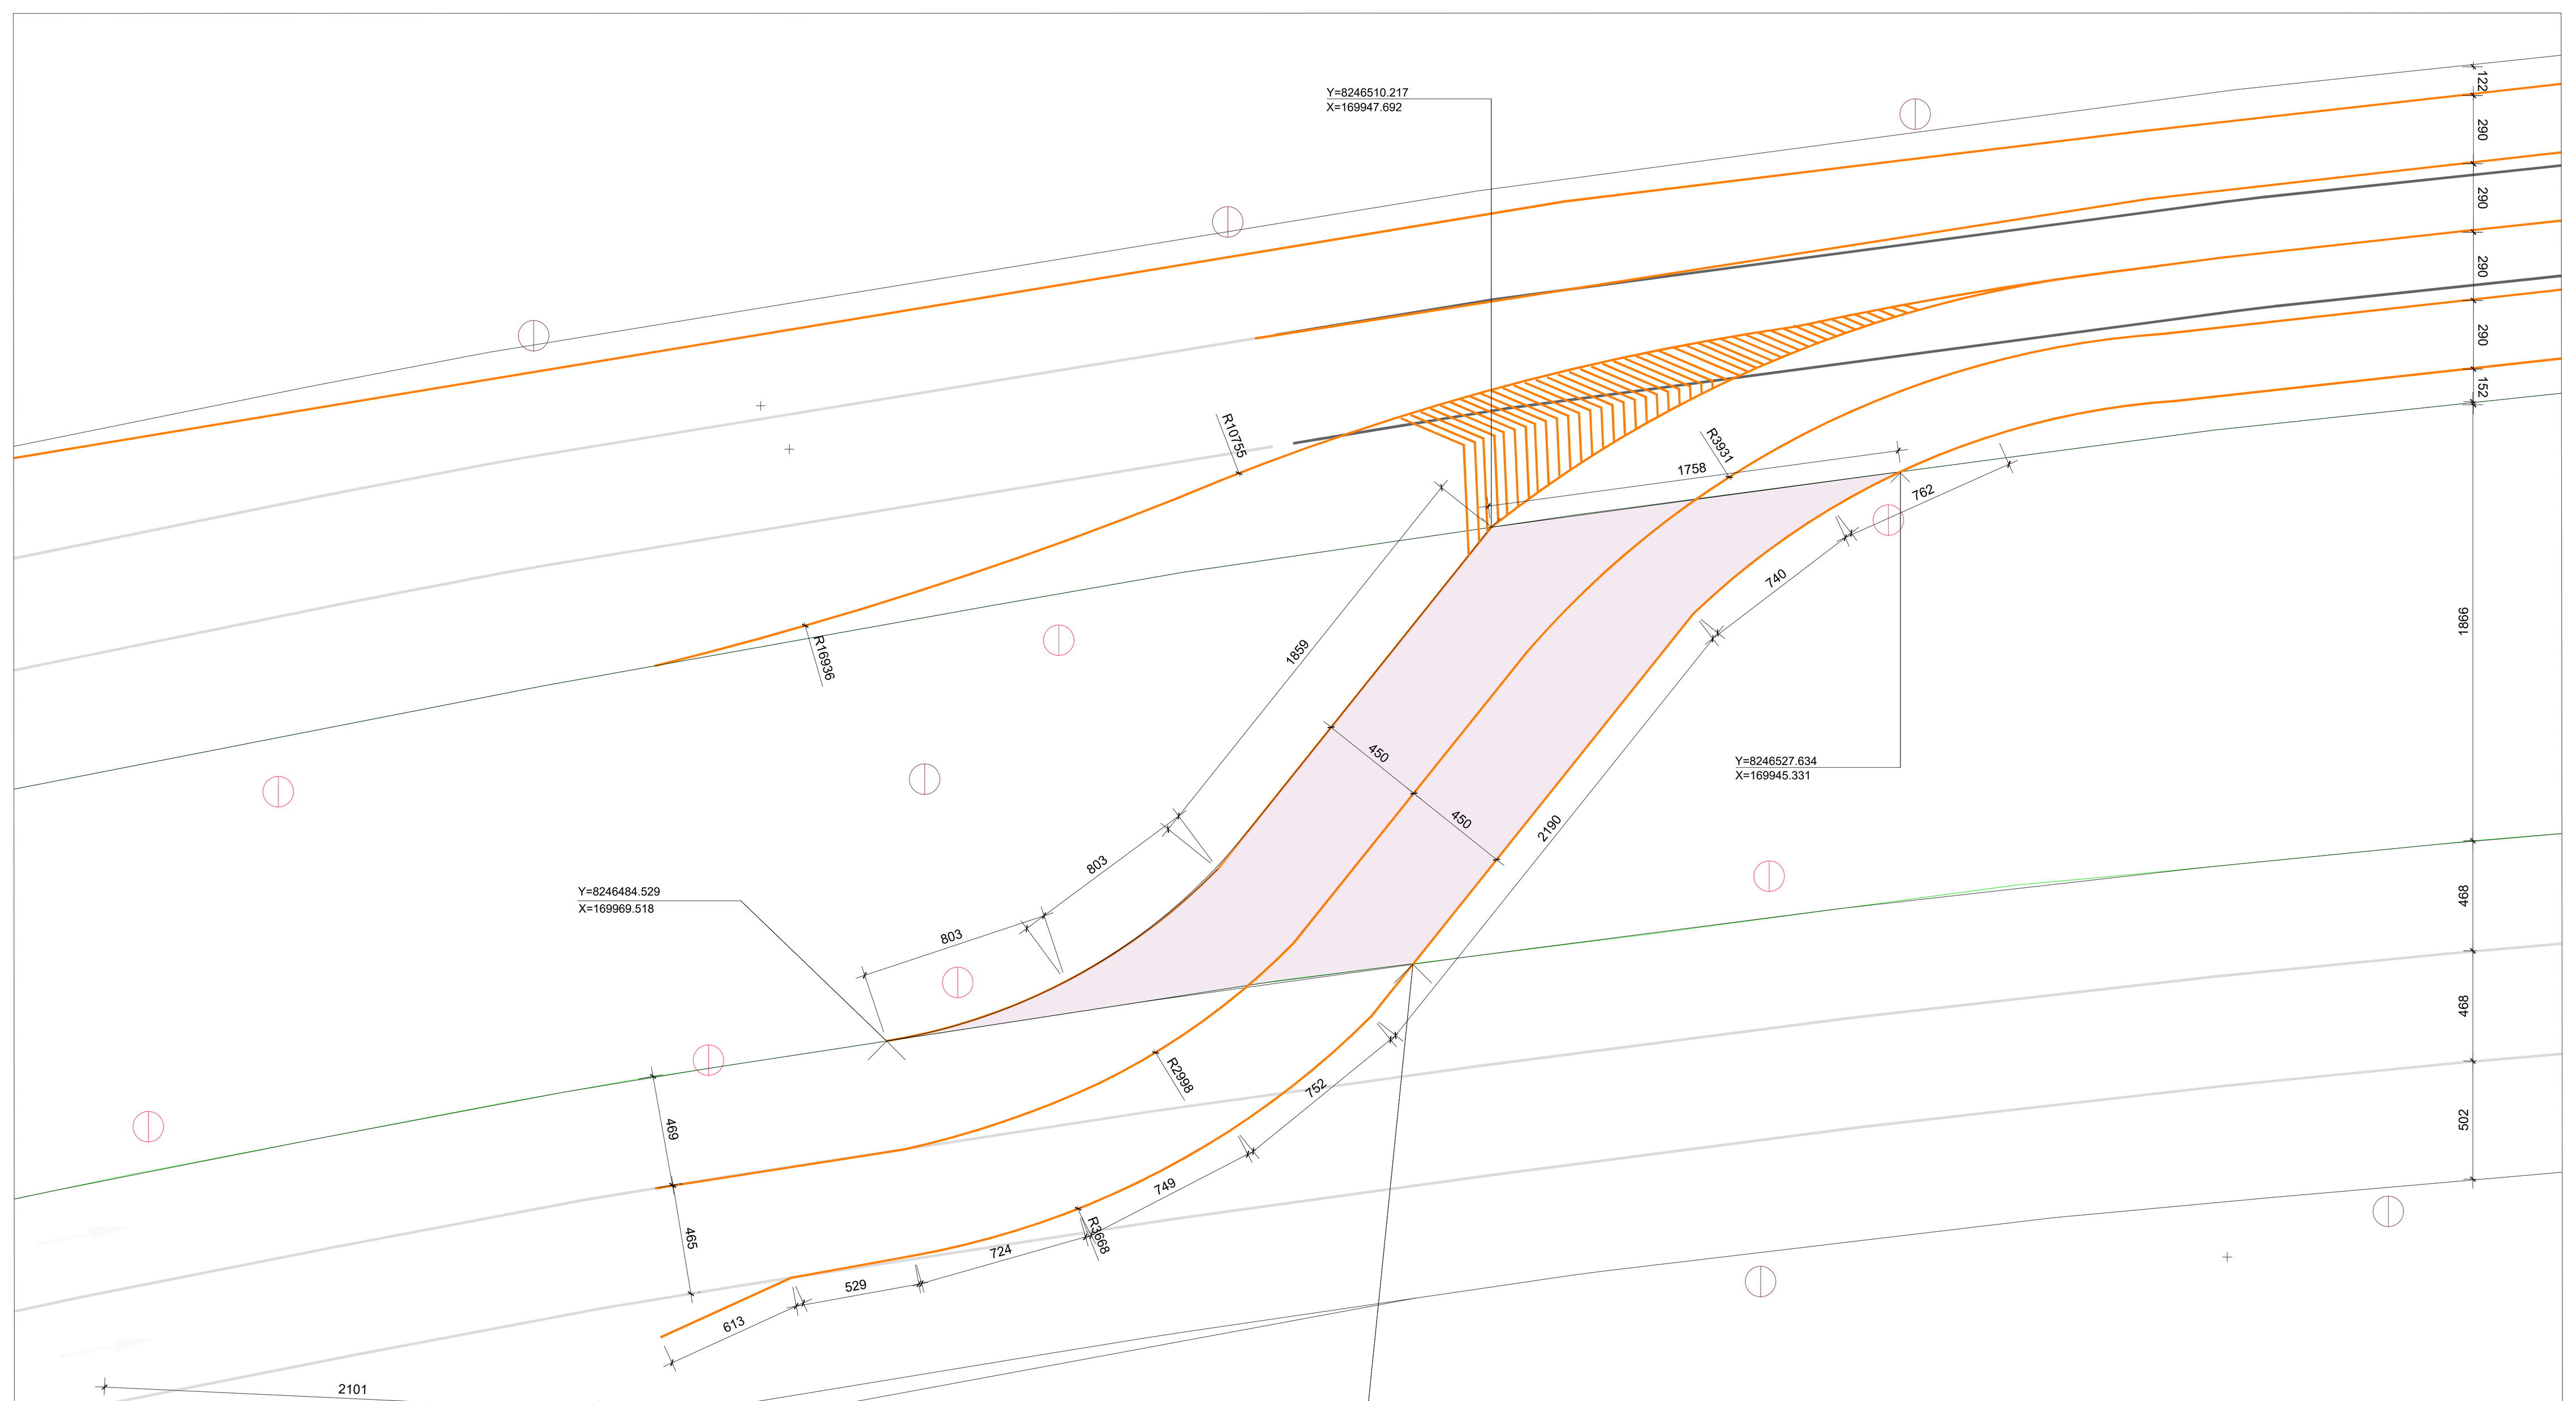

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA - DETALHAMENTO DESVIO 2 FASE 01
FASE 01
SEM ESCALA

NOTAS FASE 01

- FASE 01 SERÁ APAGADO UM TOTAL DE 492 METROS DE FAIXAS EXISTENTES, E 2524,26 METROS DE FAIXAS DEVERÃO SER PINTADAS TEMPORARIAMENTE, INCLUINDO OS DESVIOS COMO CONSTA NO DESENHO;
- TAPUME FASE 01 - 240,78 METROS
- ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;

LEGENDA - EQUIPAMENTOS - VIADUTO TAGUATINGA/SAMAMBAIA- FASE 01

MODELO	DESCRIÇÃO	QNT.
	TACHAS	346 Unidades
	BARREIRA PLÁSTICA	14 Unidades
	CAVALETE COM LUZ CONTÍNUA	12 Unidades
	BALIZADOR MÓVEL -RETRORREFLETÍVEL	45 Unidades

LEGENDA - SINALIZAÇÃO - FASE 01

TIPO DE PLACA		PLACA PRINCIPAL			PLACA COMPLEMENTAR			RESUMO	
MODELO	DESCRIÇÃO	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)	QNT. (und)	ÁREA TOTAL (m²)
	PLACA TIPO A-24 + PLACA COMPLEMENTAR "A 50 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	2	3,14
	PLACA TIPO A-24 + PLACA COMPLEMENTAR "A 100 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	2	3,14
	PLACA TIPO A-21b + PLACA COMPLEMENTAR "A 50 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	1	1,57
	PLACA TIPO A-21b + PLACA COMPLEMENTAR "A 100 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	1	1,57
	PLACA TIPO A-21c + PLACA COMPLEMENTAR "A 50 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	1	1,57
	PLACA TIPO A-21c + PLACA COMPLEMENTAR "A 100 m" - MÓVEL	0,80	0,80	0,64	0,55	1,70	0,93	1	1,57
	"ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES A 100 m" - MÓVEL				1,60	3,60	5,76	2	11,52
	"ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES A 50 m" - MÓVEL				1,60	3,60	5,76	2	11,52
	"ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHÕES" - MÓVEL				1,20	3,60	4,32	2	8,64
	"DESVIO À ESQUERDA" - MÓVEL				0,70	2,10	1,47	2	2,94
	"DESVIO À DIREITA" - MÓVEL				0,70	2,10	1,47	2	2,94
	"REDUZA A VELOCIDADE" - MÓVEL				1,20	3,60	4,32	2	8,64
	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 40km/h	d=0,80		2,01				8	16,08
	"FIM DAS OBRAS" - MÓVEL				0,60	2,60	1,56	2	3,12
	"FIM DAS OBRAS" - MÓVEL				0,60	2,60	1,56	2	3,12

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03	----	----	----	----
R02	----	----	----	----
R01	----	----	----	----
R00	EMISSÃO INICIAL	31/10/2022	PÉRCIA	HENRIQUE

SETOR: TAGUATINGA-DF
ENDEREÇO: VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS R.A. DE TAGUATINGA E SAMAMBAIA, SETOR L NORTE, NA QNL 1/2
PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
AUTOR DO PROJETO: LUIS HENRIQUE VERAS FILHO — RRT/ART: 12502212
RESP. TÉCNICO: — RRT/ART:

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
AUTORES DO PROJETO: LUIS HENRIQUE VERAS FILHO — CAU/CREA: A39126-3
RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

RA
OUTROS
RA

NOVACAP
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO BÁSICO DO CANTEIRO DE OBRAS
DESTINAÇÃO: OBRA DE ARTE
NOME DO PROJETO: REC. ESTRUTURAL E REABILITAÇÃO DAS PONTES SOBRE O CÓRR. TAGUATINGA
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO: FASE 01 - SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E DESVIOS
Nº DO PROJETO: PROJ-DE-027-22
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
ESCALA: INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-027-22-ARQ-PB-002-GER-STM-R00
SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ 002 REV.00

A0 - 1189 x 841mm

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978
