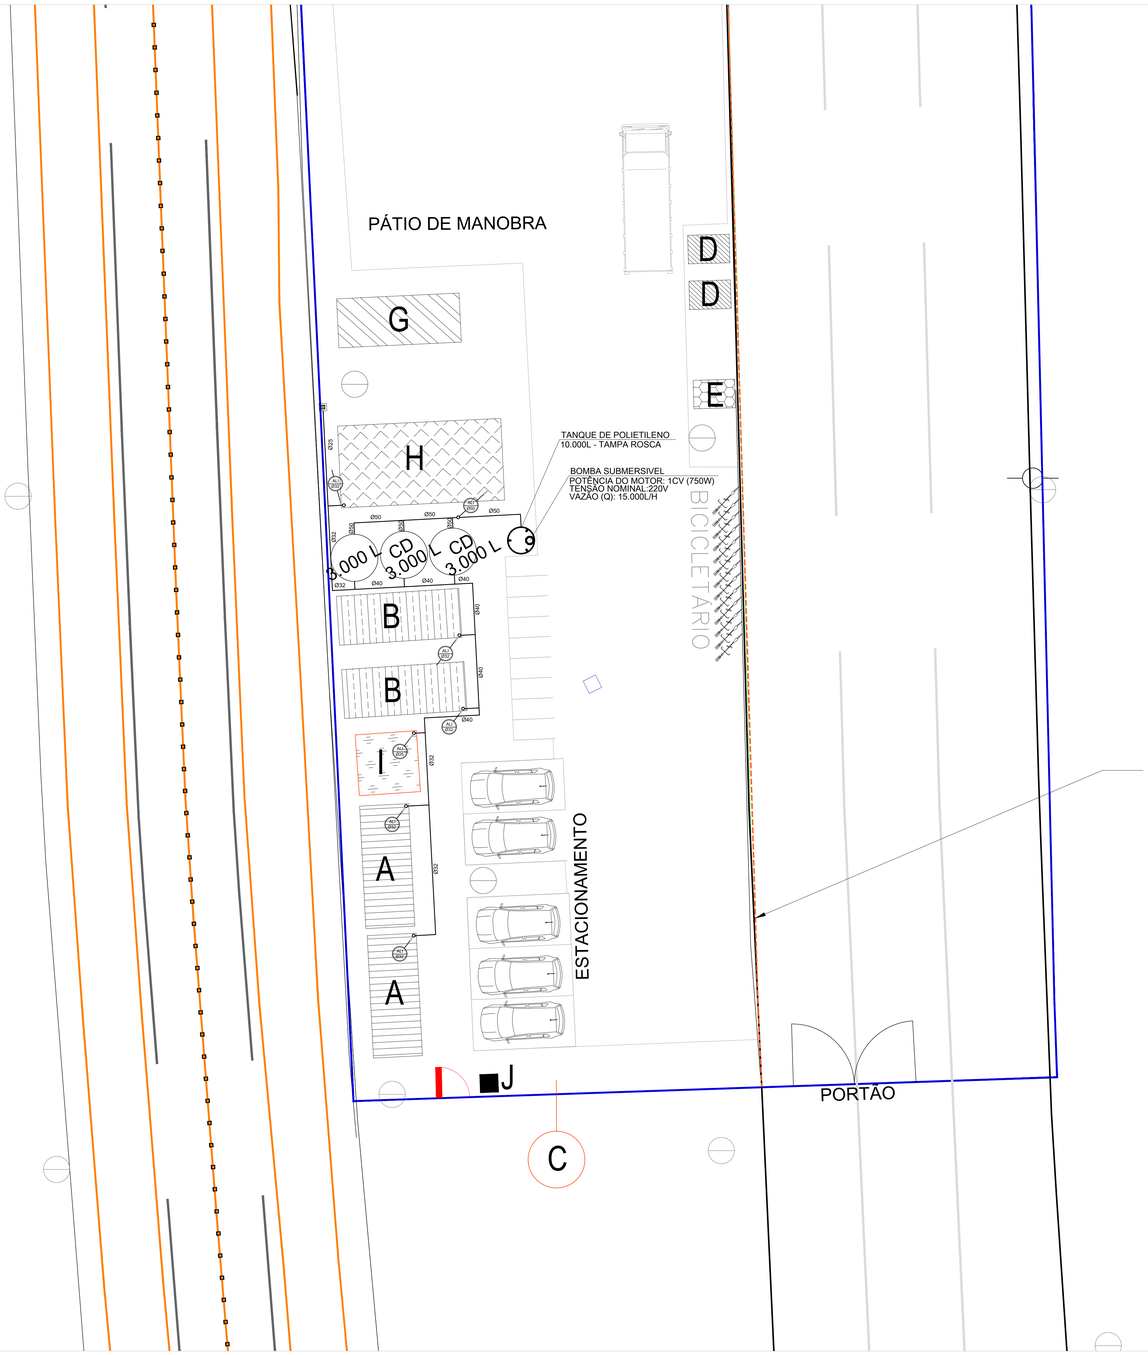


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/100

LEGENDA:

- —·—·— – TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO;
- —·—·— – TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PREDIAL;
- —··—·— – TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM;
- – CAIXA TÍPICA PARA TORNEIRA DE JARDIM E REGISTRO ESFÉRICO;
- – CAIXA D'AGUA CAP. 3000L
- – TANQUE DE POLIETILENO, 10.000L – TAMPA ROSCA

ESPECIFICAÇÕES


1 – NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER USADOS TUBOS DE PVC SOLDÁVEL TIPO RÍGIDO, CLASSE 15 (PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5Kg/cm2);
2 – NAS TUBULAÇÕES DE PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 P/ ÁGUA FRIA DEVERÃO SER USADAS CONEXÕES DE PVC SIMPLES TIPO SOLDÁVEL CLASSE 15;
3 – NOS PONTOS DE LIGAÇÃO DOS APARELHOS DEVERÃO SER USADAS CONEXÕES DE PVC REFORÇADAS TIPO SOLDA E ROSCA, REFORÇADA COM BUCHA DE LATÃO INTERNAMENTE E ANEL DE FERRO ZINCADO EXTERNAMENTE, CLASSE 15;
4 – PARA AS VEDAÇÕES DEVERÃO SER UTILIZADOS ADESIVOS PLÁSTICOS NAS JUNTAS DE PVC E FITA PLÁSTICA TIPO TEFLON NAS ROSCAS.

OBSERVAÇÕES

1 – QUANDO NÃO HOUVER INDICAÇÃO DO MATERIAL DAS TUBULAÇÕES ESTE SERÁ DE – PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL;
2 – NÃO SE ADMITE FAZER CONEXÕES OU CURVAS NA OBRA, DEVE–SE APLICAR CONEXÕES PRÉ–FABRICADAS;
3 – AS TUBULAÇÕES QUE PERFURAM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER SOLIDARIAS COM OS MESMOS, ANTES DA CONCRETAGEM DEVE–SE DEIXAR PASSAGEM COM TUBO DE DIAMETRO UM PONTO MAIOR QUE O TUBO PASSANTE;
4 – AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NO SOLO NÃO DEVEM SER COLOCADAS TENSIONADAS, DEVE–SE FAZER LEITO COM AREIA GROSSA OU TERRA SOLTA SEM RELEVO;
5 – A DISTÂNCIA PERCORRIDA NO PONTO DE LIGAÇÃO DA REDE DA CAESB ATÉ O HIDRÔMETRO SERÁ DE APROXIMADAMENTE 15,00 m.
6 – PARA INSTALAÇÕES INTERNAS VER PROJETO DA SERGETH – DESENHO HID 02/12 E 03/12.

LEGENDA

SÍMBOLO	ITEM	QT.	DESCRIMINAÇÃO
	A	02	MÓDULO ESCRITÓRIO TERMO-ACÚSTICO 6,05 x 2,42 x 2,59 m
	B	02	MÓDULO BANHEIRO/VESTIÁRIO TERMO-ACÚSTICO 6m x 2,40m x 2,59m
	C	240,13m fase1 329,96m fase2	TAPUME A SER INSTALADO
	D	02	CONTAINERS PARA ENTULHO
	E	01	GERADOR DE 13 CV - OPCIONAL
	F	50m²	ÁREA DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E FABRICAÇÃO SOMENTE COM COBERTURA - 10 X 5m
	G	01	CONTAINER 2,40X12m PARA DEPÓSITO
	H	32m²	REFEITÓRIO 8 X 4m - PADRÃO NR-18
	I	01	AMBULATÓRIO 3,00 X 3,00 X 2,50m
■	J	01	GUARITA 2X2 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

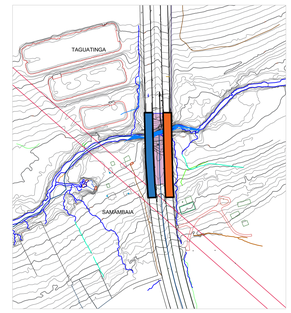

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. SEM ESCALA

ESTE PROJETO DE CANTEIRO TEM CARÁTER PROPOSITIVO, O MESMO PODERÁ SER REVISTO PELA CONSTRUTORA EM FUNÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DESDE QUE, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

REV	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03	-	-	-	-
R02	-	-	-	-
R01	ACRÉSCIMO DE PONTOS DE CONSUMO	01/08/2023	HIGO	HIGO
R00	PROJETO INICIAL	04/07/2023	HIGO	HIGO

OBS.:
1 - PARA EFEITO DE ORÇAMENTAÇÃO, DEVEREMOS CONSIDERAR A EXISTENCIA DE REDE ELÉTRICA NO LOCAL;
2 - NÃO HÁ REDE HIDROSANITÁRIA NO LOCAL - EXECUTAR FOSSA E ABASTECER CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA;

SETOR:	TAGUATINGA-DF
ENDEREÇO:	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS R.A. DE TAGUATINGA E SAMAMBAIA, SETOR L NORTE, NA QNL 1/2
PROPRIETÁRIO:	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
AUTOR DO PROJETO:	HIGO FONSECA GOMES — RRT/ART: 0720230053881
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

AUTORES DO PROJETO: HIGO FONSECA GOMES — CAU/CREA: 23.685/D-DF

RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

RA | OUTROS | RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO
DESTINAÇÃO:	OBRA DE ARTE
NOME DO PROJETO:	REC. ESTRUTURAL E REABILITAÇÃO DAS PONTES SOBRE O CÓRR. TAGUATINGA
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Nº DO PROJETO:	PROJ-DE-027-22
DATA DE EMISSÃO:	01/08/2023
ESCALA:	INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DE-027-22-HAF-PE-001-IMP-GER-R01
SIGLA / NÚMERO / REVISÃO	HAF 001 REV.01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm
