F
MONTAGEM
ESTOCAGEM
PÁTIO DE MANOBRA
D
D
G
E
H
I
B
B
A
A
J
BICICLETÁRIO
ESTACIONAMENTO
PORTÃO
LEADER
C
CI-01
CI-02
CI-03
CI-04
CI-05
3.000 L CD
3.000 L CD
3.000 L
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,80
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20
Ø100 ±1,0% DH=1,20

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/100

LEGENDA			
SÍMBOLO	ITEM	QT.	DESCRIMINAÇÃO
	A	02	MÓDULO ESCRITÓRIO TERMO-ACÚSTICO 6,05 x 2,42 x 2,59 m
	B	02	MÓDULO BANHEIRO/VESTIÁRIO TERMO-ACÚSTICO 6m x 2,40m x 2,59m
	C	240,13m fase1 329,90m fase2	TAPUME A SER INSTALADO
	D	02	CONTAINERS PARA ENTULHO
	E	01	GERADOR DE 13 CV - OPCIONAL
	F	50m²	ÁREA DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E FABRICAÇÃO SOMENTE COM COBERTURA - 10 X 5m
	G	01	CONTAINER 2,40X12m PARA DEPÓSITO
	H	32m²	REFEITÓRIO 8 X 4m - PADRÃO NR-18
	I	01	AMBULATÓRIO 3,00 X 3,00 X 2,50m
	J	01	GUARITA 2X2 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

LEGENDA

CE	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES
	TUBO DE ESGOTO SECUNDARIO
	FOSSA SEPTICA – CODIGO SINAPI – 00039361, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

NOTAS:

1. OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 150mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBOS COM DIÂMETRO ATÉ 75mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 100mm;

3. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES. NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 90cm;

4. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS CI E PV DEVERÃO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO "ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;


5. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS CI DEVERÃO SER DO TIPO LEVE. O TAMPÃO DO PV DEVERÁ SER DO TIPO PESADO;

6. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

7. AS COTAS DOS GREIDES NAS "CI" E "PV" SÃO MÍNIMAS PODENDO AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO. ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;

8. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

9. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS.

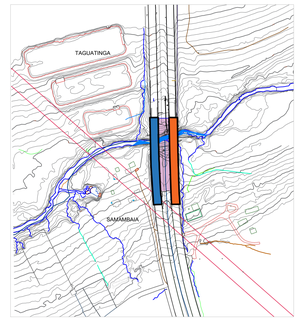

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. SEM ESCALA

ESTE PROJETO DE CANTEIRO TEM CARÁTER PROPOSITIVO, O MESMO PODERÁ SER REVISTO PELA CONSTRUTORA EM FUNÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DESDE QUE, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

REV	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R03	-	-	-	-
R02	-	-	-	-
R01	ACRÉSCIMO DE PONTOS DE CONSUMO	01/08/2023	HIGO	HIGO
R00	PROJETO INICIAL	04/07/2023	HIGO	HIGO

OBS.:
1 - PARA EFEITO DE ORÇAMENTAÇÃO, DEVEREMOS CONSIDERAR A EXISTENCIA DE REDE ELÉTRICA NO LOCAL;
2 - NÃO HÁ REDE HIDROSANITÁRIA NO LOCAL - EXECUTAR FOSSA E ABASTECER CANTEIRO COM CAMINHÃO PIPA;

SETOR:	TAGUATINGA-DF
ENDEREÇO:	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE AS R.A. DE TAGUATINGA E SAMAMBAIA, SETOR L NORTE, NA QNL 1/2
PROPRIETÁRIO:	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
AUTOR DO PROJETO:	HIGO FONSECA GOMES — RRT/ART: 0720230053881
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

AUTORES DO PROJETO: HIGO FONSECA GOMES — CAU/CREA: 23.685/D-DF

RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO
DESTINAÇÃO:	OBRA DE ARTE
NOME DO PROJETO:	REC. ESTRUTURAL E REABILITAÇÃO DAS PONTES SOBRE O CÓRR. TAGUATINGA
DESCRIÇÃO, CONTEUDO:	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Nº DO PROJETO:	PROJ-DE-027-22
DATA DE EMISSÃO:	01/08/2023
ESCALA:	INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DE-027-22-HES-PE-001-IMP-GER-R01
SIGLA / NÚMERO / REVISÃO	HES 001 REV.01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

A0 - 1189 x 841mm
