
NOVACAP — COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	**Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - NBR 6484/2001**	SPT 01	EMISSÃO: 28/04/22 CÓDIGO: S.R.T. - 01 REVISÃO: - FOLHA: 01

EMPRESA: NOVACAP
CONTRATO Nº
OBRA: ESTUDOS GEOTÉCNICOS
TRECHO: FUTURAS INSTALAÇÕES DA DIOD

DATA DE INÍCIO: 27/04/2022
DATA DE TÉRMINO: 27/04/2022
SONDADOR: EQUIPE

Nº GOLPES / 30 cm		CONSISTÊNCIA
PENETRAÇÃO		MUITO MOLE / MOLE / MÉDIA (O) / RIJA (O) / DURA (O)
INICIAL	FINAL	
4	4	
4	4	
4	4	
5	6	
6	6	
6	6	
7	9	
10	11	
17	20	
22	23	
30	33	
42	44	
OBS:	**24/15**	

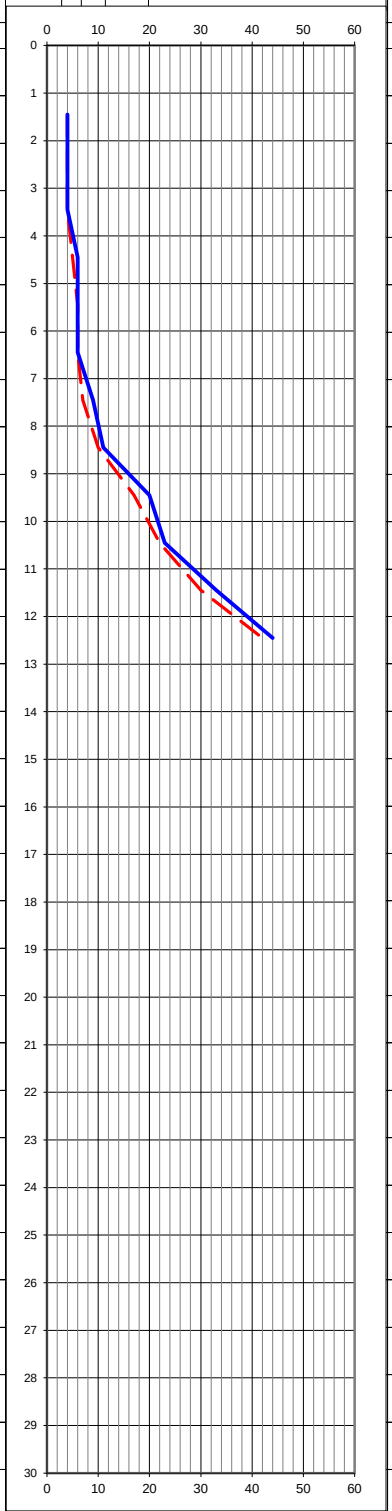

COTA	FOFA (O)	POUCO COMPACTA (O)	MEDIANAMENTE COMPACTA (O)	COMPACTA (O)	MUITO COMPACTA (O)
0,00					
ESCALA					
	COMPACIDADE				

PESO BATENTE	**65,0 Kg**
ALTURA DE QUEDA	**75 cm**
REVESTIMENTO	**2 1/2"**

Amostra Nº	profund. m	N.A m	CAMADAS (m)
	1,00	0,00	
1	1,45		
2	2,45		
3	3,45		
4	4,45		
5	5,45		
6	6,45		
7	7,45		
8	8,45		
9	9,45		
10	10,45		
11	11,45		
12	12,45		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA (m)

INICIAL	**0,00**	27/04/2022	15:45
FINAL	**0,00**	28/04/2022	15:45

Umid. Nat. %	LL %	IP %	# 200 %	IG nº	CLASSIFICAÇÃO TÁTIL/VISUAL DAS AMOSTRAS
					Argila vermelha com pedrisco
					Argila vermelha-Muito mole
					Argila vermelha-Mole
					Argila vermelha-Mole
					Argila vermelha-Média
					Argila vermelha-Média
					Argila vermelha-Média
					Argila vermelha-Média
					Argila vermelha-Rija
					Argila vermelha-Dura
					Argila vermelha -Dura
					Argila varieg siltosa -Dura
					Silte variegado-Duro

AMOSTRADOR	
Ø INTERNO	**1 3/8"**
Ø EXTERNO	**2"**
PROF. DO REVEST.	

OBS:
LIMITE DO FURO 12,45 m
N.A. FINAL 0,00 m
N 24/15

Técnico responsável
