



Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Departamento de Compras

Divisão de Licitações e Contratos

Comunicado - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

ERRATA Nº 001/2024

Prezados(as) Senhores(as),

Comunicamos a V.Sas. para considerar a seguinte ERRATA no Termo de Referência 15 (144702439):

Onde se lê:

21.1..7. Atender integralmente as exigências contidas no documento **CE GIGOVBR 1220/2024: FSDF - CAIXA - CR 944928/2023** (E-mail CE_GIGOVBR_1220_2024__FSDF__CAIXA 144415235);

Leia-se:

21.1..7. Atender integralmente as exigências contidas no documento **CE GIGOVBR 1220/2024: FSDF - CAIXA - CR 944928/2023** (E-mail CE_GIGOVBR_1220_2024__FSDF__CAIXA 144415235), bem como inserir as devidas informações no Módulo de Obras, cujo intuito é garantir o adequado Acompanhamento das Obras junto a Plataforma Transferegov.br, conforme o [Manual Empresa](#).

Tendo em vista que a errata não modifica a formulação da proposta, permanecem inalteradas as demais condições do Edital e seus anexos.

Aline Alves de Oliveira

Chefe do DECOMP/DA

respondendo



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES DE OLIVEIRA - Matr.0973569-0, Chefe do Departamento de Compras Interino(a)**, em 26/07/2024, às 11:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **146930733** código CRC= **F75D9C6A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br

00112-00027924/2023-18

Doc. SEI/GDF 146930733

Responder a todos | Eliminar Lixo | ...

COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOVBR 1220/2024: FSDF - CAIXA - CR 944928/2023 Apresenta apontamentos do LAE

GIGOVBR05 - Repasse Norte <gigovbr05@caixa.gov.br>

Hoje, 09:26

Fsdf; agendafundodesaude@gmail.com; Gerência de Acompanhamento de Convênios e Instrumentos Congêneres - GACIC/DACGA/SUAG/SES; gacic.ses+7

Caixa de Entrada

MO28068021.dot

178 KB

Transferir

E-mail classificado como #PUBLICO

Ao

Fundo de Saúde do Distrito Federal

c/c

SEGOV/DF

SERINS/DF

NOVACAP

Senhor Diretor Executivo,

1. Em complementação à CE GIGOVBR 1220/2024, informamos as pendências e prazos para atendimento:

Pendências	Prazos
1. Apresentar o projeto de engenharia (projetos básico e executivo) acompanhado da aprovação dos órgãos competentes (GDF, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária, concessionárias de serviços públicos etc.) ou sua dispensa e de ART/RRT dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos.	Para Primeiro Desbloqueio
2. Ateste da aprovação pelo Conveniente dos produtos entregues, comprovado por meio de declaração informando a aprovação da solução metodológica ou tecnológica proposta pelo vencedor, quanto à adequação do projeto em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas.	Para Primeiro Desbloqueio
3. Declaração do Conveniente de que os projetos apresentados atendem aos requisitos elencados no anteprojeto e que cumprem integralmente o Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Saúde.	Para Primeiro Desbloqueio
4. Caso existam alterações em relação ao anteprojeto aceito na fase de análise, apresentar parecer técnico circunstanciado, acompanhado de ART/RRT, indicando: quais foram as alterações significativas, em relação ao anteprojeto; que não há redução em relação à qualidade e vida útil definidas na documentação técnica apresentada; quais foram os impactos em relação às obrigações de meio e de resultado e às condições originais definidas na documentação técnica apresentada.	Para Primeiro Desbloqueio
5. Apresentar proposição de novo eventograma para o acompanhamento da obra, em conformidade ao projeto elaborado, mantendo-o coerente com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da obra de maneira intuitiva.	Para Primeiro Desbloqueio
6.Caso haja alteração do cronograma físico-financeiro após a contratação, o eventograma do item Administração Local deverá ser revisado de modo que a o desbloqueio desse item aconteça proporcionalmente à execução da obra.	Para Autorização de Início de Objeto (AIO)
7. Apresentar Declaração de Conformidade em Acessibilidade, informando o atendimento aos requisitos de acessibilidade estabelecidos pela Lei nº 10.098/2000, acompanhada de ART/RRT de acessibilidade (admissível em conjunto com ART/RRT de projeto).	Para Primeiro Desbloqueio
8. Apresentar autorização ambiental para atividades acessórias de terraplanagem emitida pelo órgão ambiental competente (Brasília Ambiental – Ibram). (Obs.: Condição informada na Manifestação Ambiental nº 1358/2023 emitida pela Divisão de Meio Ambiente da NOVACAP)	Para Primeiro Desbloqueio
9. Apresentar autorização ambiental para o corte de árvores isoladas que se faça necessário, emitida pelo órgão ambiental	
10. Apresentar manifestação ambiental quanto à rede de drenagem do estacionamento de veículos e quanto à interligação de áreas não drenadas a sistemas de drenagem pré-existentes. (Obs.: Condição informada na Manifestação Ambiental nº 1358/2023 emitida pela Divisão de Meio Ambiente da NOVACAP)	Para Primeiro Desbloqueio
11. Conclusão da infraestrutura urbana do loteamento (pavimentação, drenagem, passeios, iluminação pública etc.) e de melhorias do sistema de água e esgotamento sanitário.	Para Último Desbloqueio
12. Instalação de placa de obra, a ser afixada no acesso principal, em local visível, conforme Orientações para instalação de placas e adesivos de obras disponíveis no "Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras" no sítio da CAIXA, na seção Downloads, assunto Gestão Urbana. Recomendamos que esta obrigação esteja prevista no Memorial Descritivo/Termo de Referência.	Para Primeiro Desbloqueio
13.Apresentação de declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como da ART/RRT do(s) responsável(is) pela execução e pela fiscalização da obra.	Para Autorização de Início de Objeto (AIO)

Atenciosamente,

Ricardo Dias Pimentel Reinoso
Assistente Sênior
Gerência Executiva de Governo – Brasília/DF

Viviane Quadros
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo – Brasília/DF

Carlos André Lins Rodriguez
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo – Brasília/DF

TUTORIAL



ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – PLE REGISTRO EXECUÇÃO

EMPRESA

Departamento de Transferências e Parcerias da União

Secretaria de Gestão e Inovação

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Registro da execução das OBRAS diretamente no Transferegov.br pela empresa EXECUTORA.

Existem, aproximadamente, 14.000 (quatorze) mil obras sendo acompanhadas pelo meio físico “papel”. O fluxo antigo gera dificuldades, visto que não há agilidade no processo, transparência ou integridade dos dados. Pensando nisso o Transferegov.br deu um grande passo: lançou mais uma evolução em seu **Módulo de Obras**, otimizando as etapas de **Projeto Básico, Licitação, Contratos e Acompanhamento das Obras**.


Nesse primeiro momento, obras acompanhadas por EVENTOS.

Vamos entender o fluxo??



Transferegov.br

Fluxo EMPRESA – Registro do processo de execução da Obra.

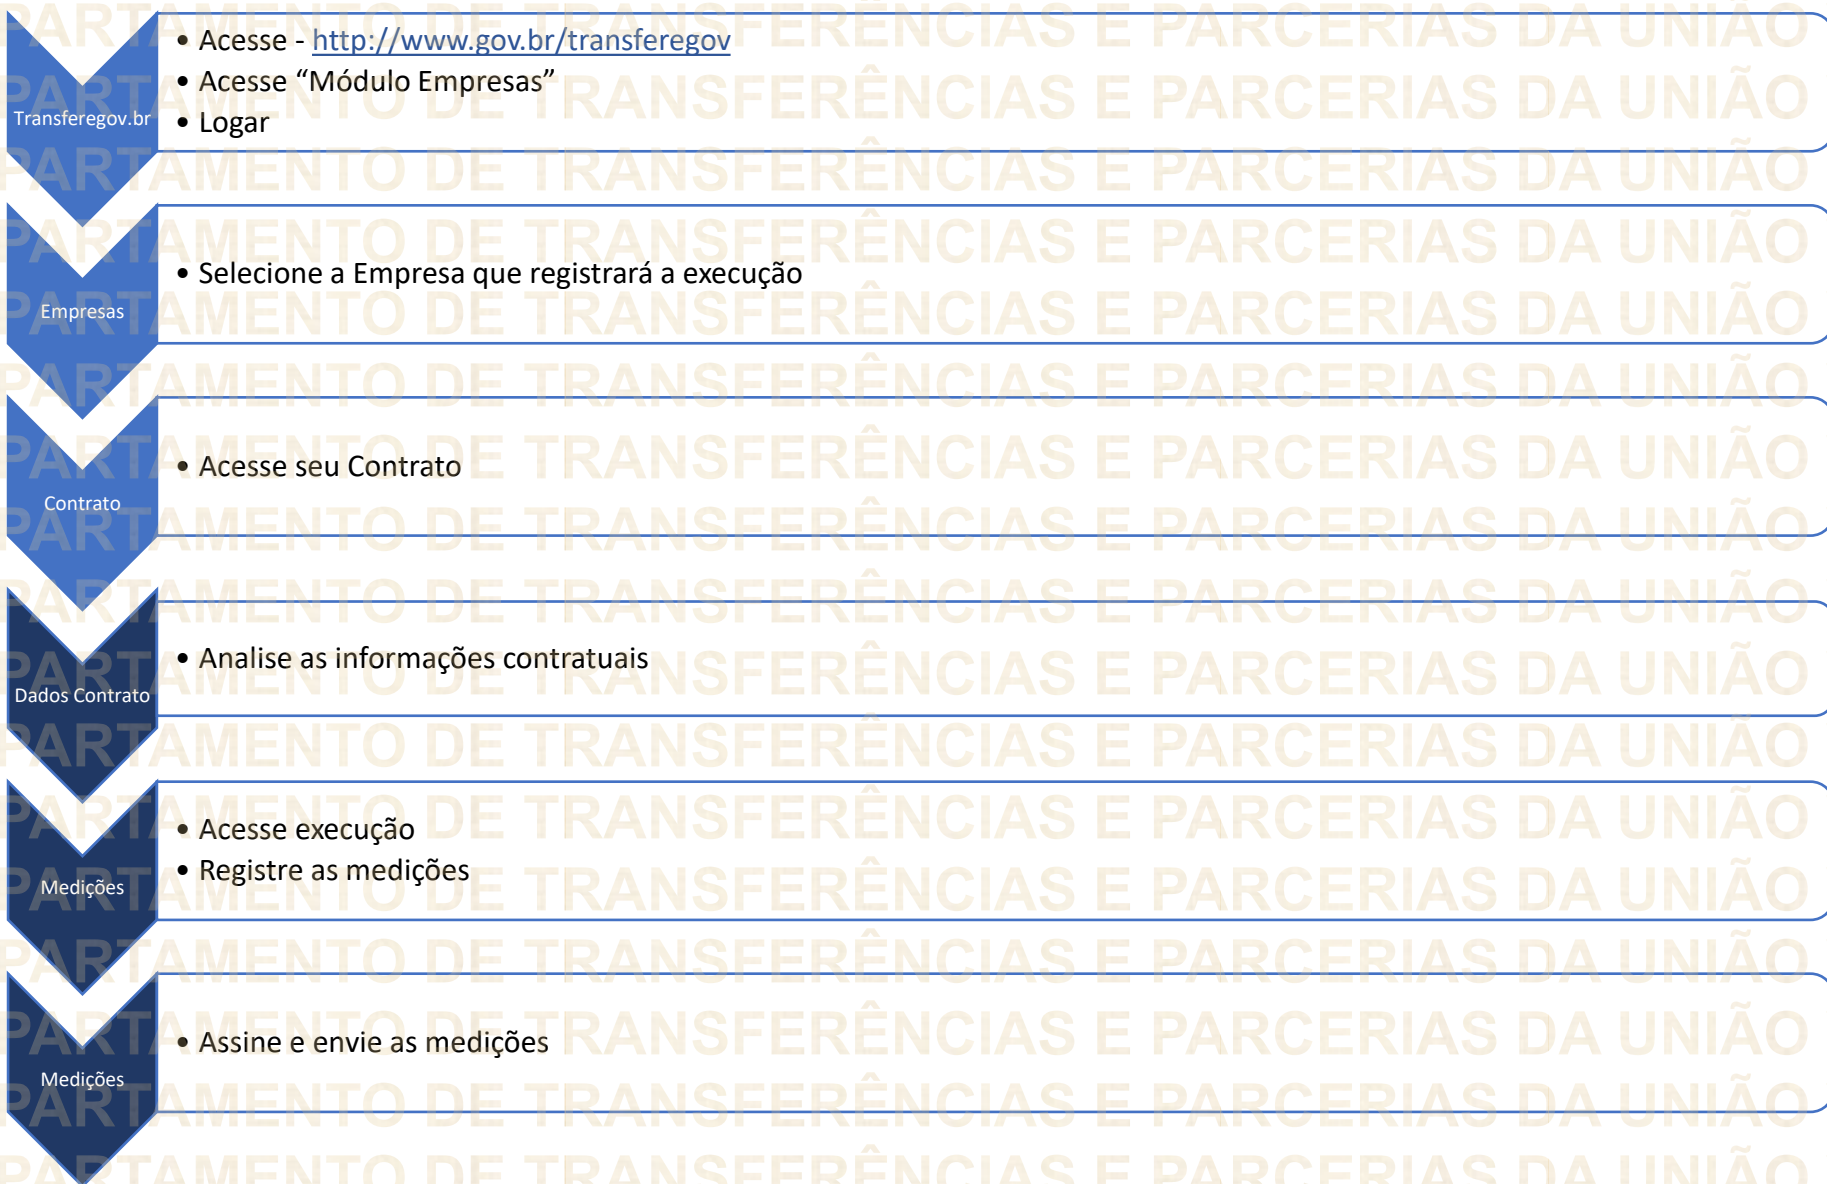

Registrar um processo de execução de OBRAS no Transferegov.br.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que a EMPRESA

- Tenha o perfil selecionado abaixo; e
- Esteja **logado** no sistema.

Perfis Associados ao Usuário



Cadastrador da Empresa



Operacional da Empresa



O Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade poderá dar o perfil para os usuários.

www.gov.br/transferegov

gov.br

Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Transferegov.br

O que você procura?




Serviços recomendados para você

Serviços mais acessados do gov.br

Serviços em destaque do gov.br

Bem-vindo ao portal sobre transferências e parcerias da União

CONHEÇA



Transferegov.br



Obrasgov.br



Gestão.gov.br



Rede de Parcerias



Acesso livre



Calendário

Após acessar o Portal, clique em Transferegov.br.

ACESSE

Selecione a opção “MÓDULO EMPRESA” para iniciar as medições.

Bem-vindo ao Transferegov

O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para utilizar os nossos serviços acesse:

Cadastros

Acessar

Módulo Empresa

Acessar



Transferências Especiais

Acessar

Transferências Fundo a Fundo

Acessar

Transferências Discricionárias e Legais

Acessar

Termo de Execução Descentralizada

Acessar

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar. Informe sua senha na próxima tela.



Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Digite seu CPF

Crie sua conta gov.br

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua conta, clicando no botão acima.

Acesse sua conta com

Número do CPF

Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

Digite seu CPF

Avançar

Clique

Banco do Brasil

Certificado digital

Certificado digital em nuvem



Digite sua senha para acessar o login único do governo federal.

Registre
sua senha e
clique em
entrar.

Digite sua senha

CPF

991.986.571-00

Senha

Digite sua senha atual



[Esqueci minha senha](#)

Cancelar

Entrar

Clique

[Dúvidas frequentes](#)

Este passo pode não ocorrer.
É apenas uma medida de
segurança do GOV.BR.

Confirmação de contato

Para prosseguir para **Plataforma - Brasil** é necessário atualizar o seu cadastro.

Celular:

Enviar código

Clique

O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de acesso. Informe seu numero e clique em "Enviar código".

Após receber o código, informe-o no campo em destaque e clique em “Validar Código”.
Se não receber o código, basta clicar em “Tentar novamente”.

Confirmação de contato

Confirmar SMS

Código enviado. Verifique as mensagens SMS no seu celular.

Código de confirmação SMS:

Digite o código recebido por Si.

Tentar novamente

Validar código

Informe

Clique

MEDICÃO
Selecionar Empresa

Escolha uma empresa para iniciar o processo de medição

Ao acessar o Transferegov.br, serão exibidos o nome e a quantidade de contratos das empresas que o usuário tenha vínculo.




2 contratos

Empresa 01


0 contrato

Empresa 02


1 contrato

Empresa 03


Vamos analisar o caso em tela.
O usuário 01, logou e foram exibidos o nome de 3 empresas. Elas estão cadastradas no Transferegov.br e esse usuário possui perfil “Operacional Empresa” nas três. Observe que a Empresa pode estar cadastrada, mas não possuir nenhum contrato ativo.

Selecione a empresa que possui o contrato que será executado. Clique no nome da empresa, conforme indicado.

MEDICÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Serão exibidos, com quadro resumo, todos os contratos vinculados à empresa.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Clique

Para exibir detalhes do instrumento contratual, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111

Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -



CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Identificação do Contrato

Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

CONTRATO DE REPASSE
869196/2018

UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

Objeto do instrumento



[Empresas](#) / [Contratos](#) / [Detalhar Responsável Técnico](#)

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Responsável Técnico

Tipo

☐ Execução

☒ Fiscalização

Data Inclusão

14/05/2021

Identificação

Nome do responsável

E-mail

E-mail do responsável

Telefone

Tel. do responsável

Após detalhar os dados do responsável, clique em “Voltar”.

Registros Profissionais

Associar

Atividade

CAU

CREA

UF

☒

Engenharia

121323

RN

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág.

10

<

1

>

Voltar



MEDIÇÃO

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART / RRT

Documento técnico

Data de Emissão

14/05/2021



Tipo ART / RRT

- ☐ Execução
- ☒ Fiscalização

Responsável Técnico

Responsável técnico



Anexo

ART.pdf

Submetas Associadas

Origem

Destino

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Associação do responsável técnico a seus documentos e a submeta de sua responsabilidade.

Clique

Voltar

MEDICÃO

Selecionar Contrato de Execução e/ou Fornecimento

Escolha um dos contratos abaixo para realizar medições.

Empresa

Contratos

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

Tutorial - Contrato

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 124.600,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
0

TERMO DE COMPROMISSO
940147/2021

UF
--

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Clique

Para as registrar as medições, clique no ícone indicado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 111

Objeto - Submeta 1

9 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 62.500,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940137/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
teste -



CONTRATO DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO 123

objeto

1 dias

VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 125.000,00

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

TERMO DE COMPROMISSO
940146/2021

UF

OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO
Proposta - Teste -



Identificação do Contrato

Objeto contratado

290 dias Quantidade de dias sem medição

VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor do instrumento

QUANTIDADE DE MEDIÇÕES CADASTRADAS
1

CONTRATO DE REPASSE
869196/2018

UF

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

Objeto do instrumento



MEDIDAÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições

Histórico

Medições

Nenhum registro encontrado.

Clique

Criar Medição

No primeiro acesso não haverá medições exibidas, mas a medida que forem ocorrendo serão exibidas e listadas aqui.

Clique em “Criar Medição”, conforme indicado, para iniciar o processo de registro.

Voltar

MEDIÇÃO

Medição 1

Informe os dados para iniciar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Medição

Data de Início do Objeto



Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

Primeiramente, informe a data de início do objeto, essa será considerada a data de início da medição.

Data Fim da Medição



Data no formato dd/mm/aaaa

Informe também a data fim da medição e clique em “Salvar Medição”, conforme indicado.

Clique

Voltar

Salvar Medição

Medição salva com sucesso.

Após registrar as datas de início e fim da medições, a submeta do projeto básico será exibida. Clique em editar, conforme indicado para registrar as medições.

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data Fim da Medição

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período Acumulado							
Total	124.600,00	Período Acumulado							

Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág.

10

« < 1 > »

Voltar

Salvar Medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Elaboração

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

— Frente de Obra: RUA A

Ao clicar na linha de descrição dos eventos, essa será detalhada, possibilitando uma melhor análise do que foi executado.

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Conveniente	Concedente
▼ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00						
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		20	M2				
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2				
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00						
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00						
▶ RAMPA DE ACESSIBILIDADE	6.750,00						
▶ DIVERSOS	1.456,00						



Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

— Frente de Obra: RUA A

A medida que for analisando os eventos, o usuário com perfil “Operacional da Empresa”, vai registrando o que foi realizado, clicando no botão indicado.

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Conveniente	Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			<input checked="" type="checkbox"/>			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		20	M2				
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		3000	M2				
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			<input checked="" type="checkbox"/>			
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA		1500	M2				
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			<input checked="" type="checkbox"/>			
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3		400	M				
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 pecas por m2)		500	M2				
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		25	M3				
Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)		20	M				
Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em calçada do passeio público		80	M2				
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			<input type="checkbox"/>			
▶ DIVERSOS	1.456,00			<input type="checkbox"/>			

Clique

Realizado

Não Realizado

Lembrando que esse acompanhamento é realizado por eventos, assim, o usuário só pode registrar se executou ou não o evento.

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Conveniente	Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			<input type="checkbox"/>			
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			<input type="checkbox"/>			
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			<input type="checkbox"/>			
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			<input type="checkbox"/>			

1.1 - Submetra: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
081.827.694-00	NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO	Empresa	3424234/RN	14/05/2021 - 21:32:49

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERSOS	1.456,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERSOS	1.456,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Após registrar a execução ou parte dela, o usuário pode “Salvar Rascunho”, opção que permite apenas registrar as informações, para posterior revisão ou complementação.

Total Medição 01 (R\$):

111.100,00

Acumulado Medição 01 (R\$):

111.100,00



Voltar

Salvar Rascunho

Assinar



Submeta salva com sucesso.



MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Ao salvar rascunho os registro podem ser revistos ou excluídos, clicando em “Excluir Rascunho”.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021Situação
Em ElaboraçãoData de Início da Medição
14/05/2021Data Fim da Medição
14/05/2021

O botão Assinar só é exibido para o usuário da Empresa que possui o perfil “Operacional da Empresa”, foi cadastrado como Responsável Técnico pela Execução da submeta e possuir uma ART ativa.

Após revisão das informações registradas, o usuário deve clicar em “Assinar”, conforme indicado. Essa Ação registra que o responsável técnico pela execução da empresa reconhece que as informações inseridas estão corretas.

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Clique

Voltar

Excluir Rascunho

Salvar Rascunho

Assinar



Submeta assinada com sucesso.



MEDIÇÃO

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Após assinar, clique em “Voltar”, conforme indicado.

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data de Início da Medição

14/05/2021

Data Fim da Medição

14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF

081.827.694-00

Nome

NEYLIANE DA CONCEICAO GONCALVES MORENO

Perfil

Empresa

CREA/CAU

3424234/RN

Data da Assinatura

14/05/2021 - 17:55:15

Clique

Serviço

Valor do Evento (R\$)

Qtde.

Unid.

Empresa

Conveniente

Concedente

SERVIÇOS PRELIMINARES

7.700,00

Concluído

Concluído

Concluído

Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

O usuário poderá salvar essa medição clicando em “Salvar Medição”. Essa opção apenas registra no sistema o que foi ou não realizado.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração


Data Fim da Medição

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Para enviar a medição para análise do fiscal do conveniente, o usuário deverá clicar em “Enviar Medição”, conforme indicado.

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

« < 1 > »

Voltar

Salvar Medição

Enviar Medição

Clique

MEDIDAÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para realizar medições.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Elaboração

Data Fim da Medição

14/05/2021

Data no formato dd/mm/aaaa

Submetas

Descrição

Valor (R\$)

Realizado

Empresa

Conveniente

Concedente

Ações

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

124.600,00

Período

111.100,00

89,17

Acumulado

111.100,00

89,17

Total

124.600,00

Período

111.100,00

89,17

Acumulado

111.100,00

89,17

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#).

Itens por pág.

10

Voltar

Salvar Medição

Enviar Medição

Conclusão da Medição

Deseja confirmar a **conclusão** da medição e envio para fiscalização?

Não

Sim

Clique

Clique em “SIM” para confirmar a conclusão da medição e o envio para fiscalização.

✓ Medição enviada com sucesso.

MEDIDAÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

Medições enviadas, perceba que a única ação possível agora é a consulta dos dados.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Enviada para o Conveniente

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021


Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					🔍
		Acumulado	111.100,00	89,17					
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					

Voltar

Clique

Caso deseje cancelar o envio, clique em "Voltar".

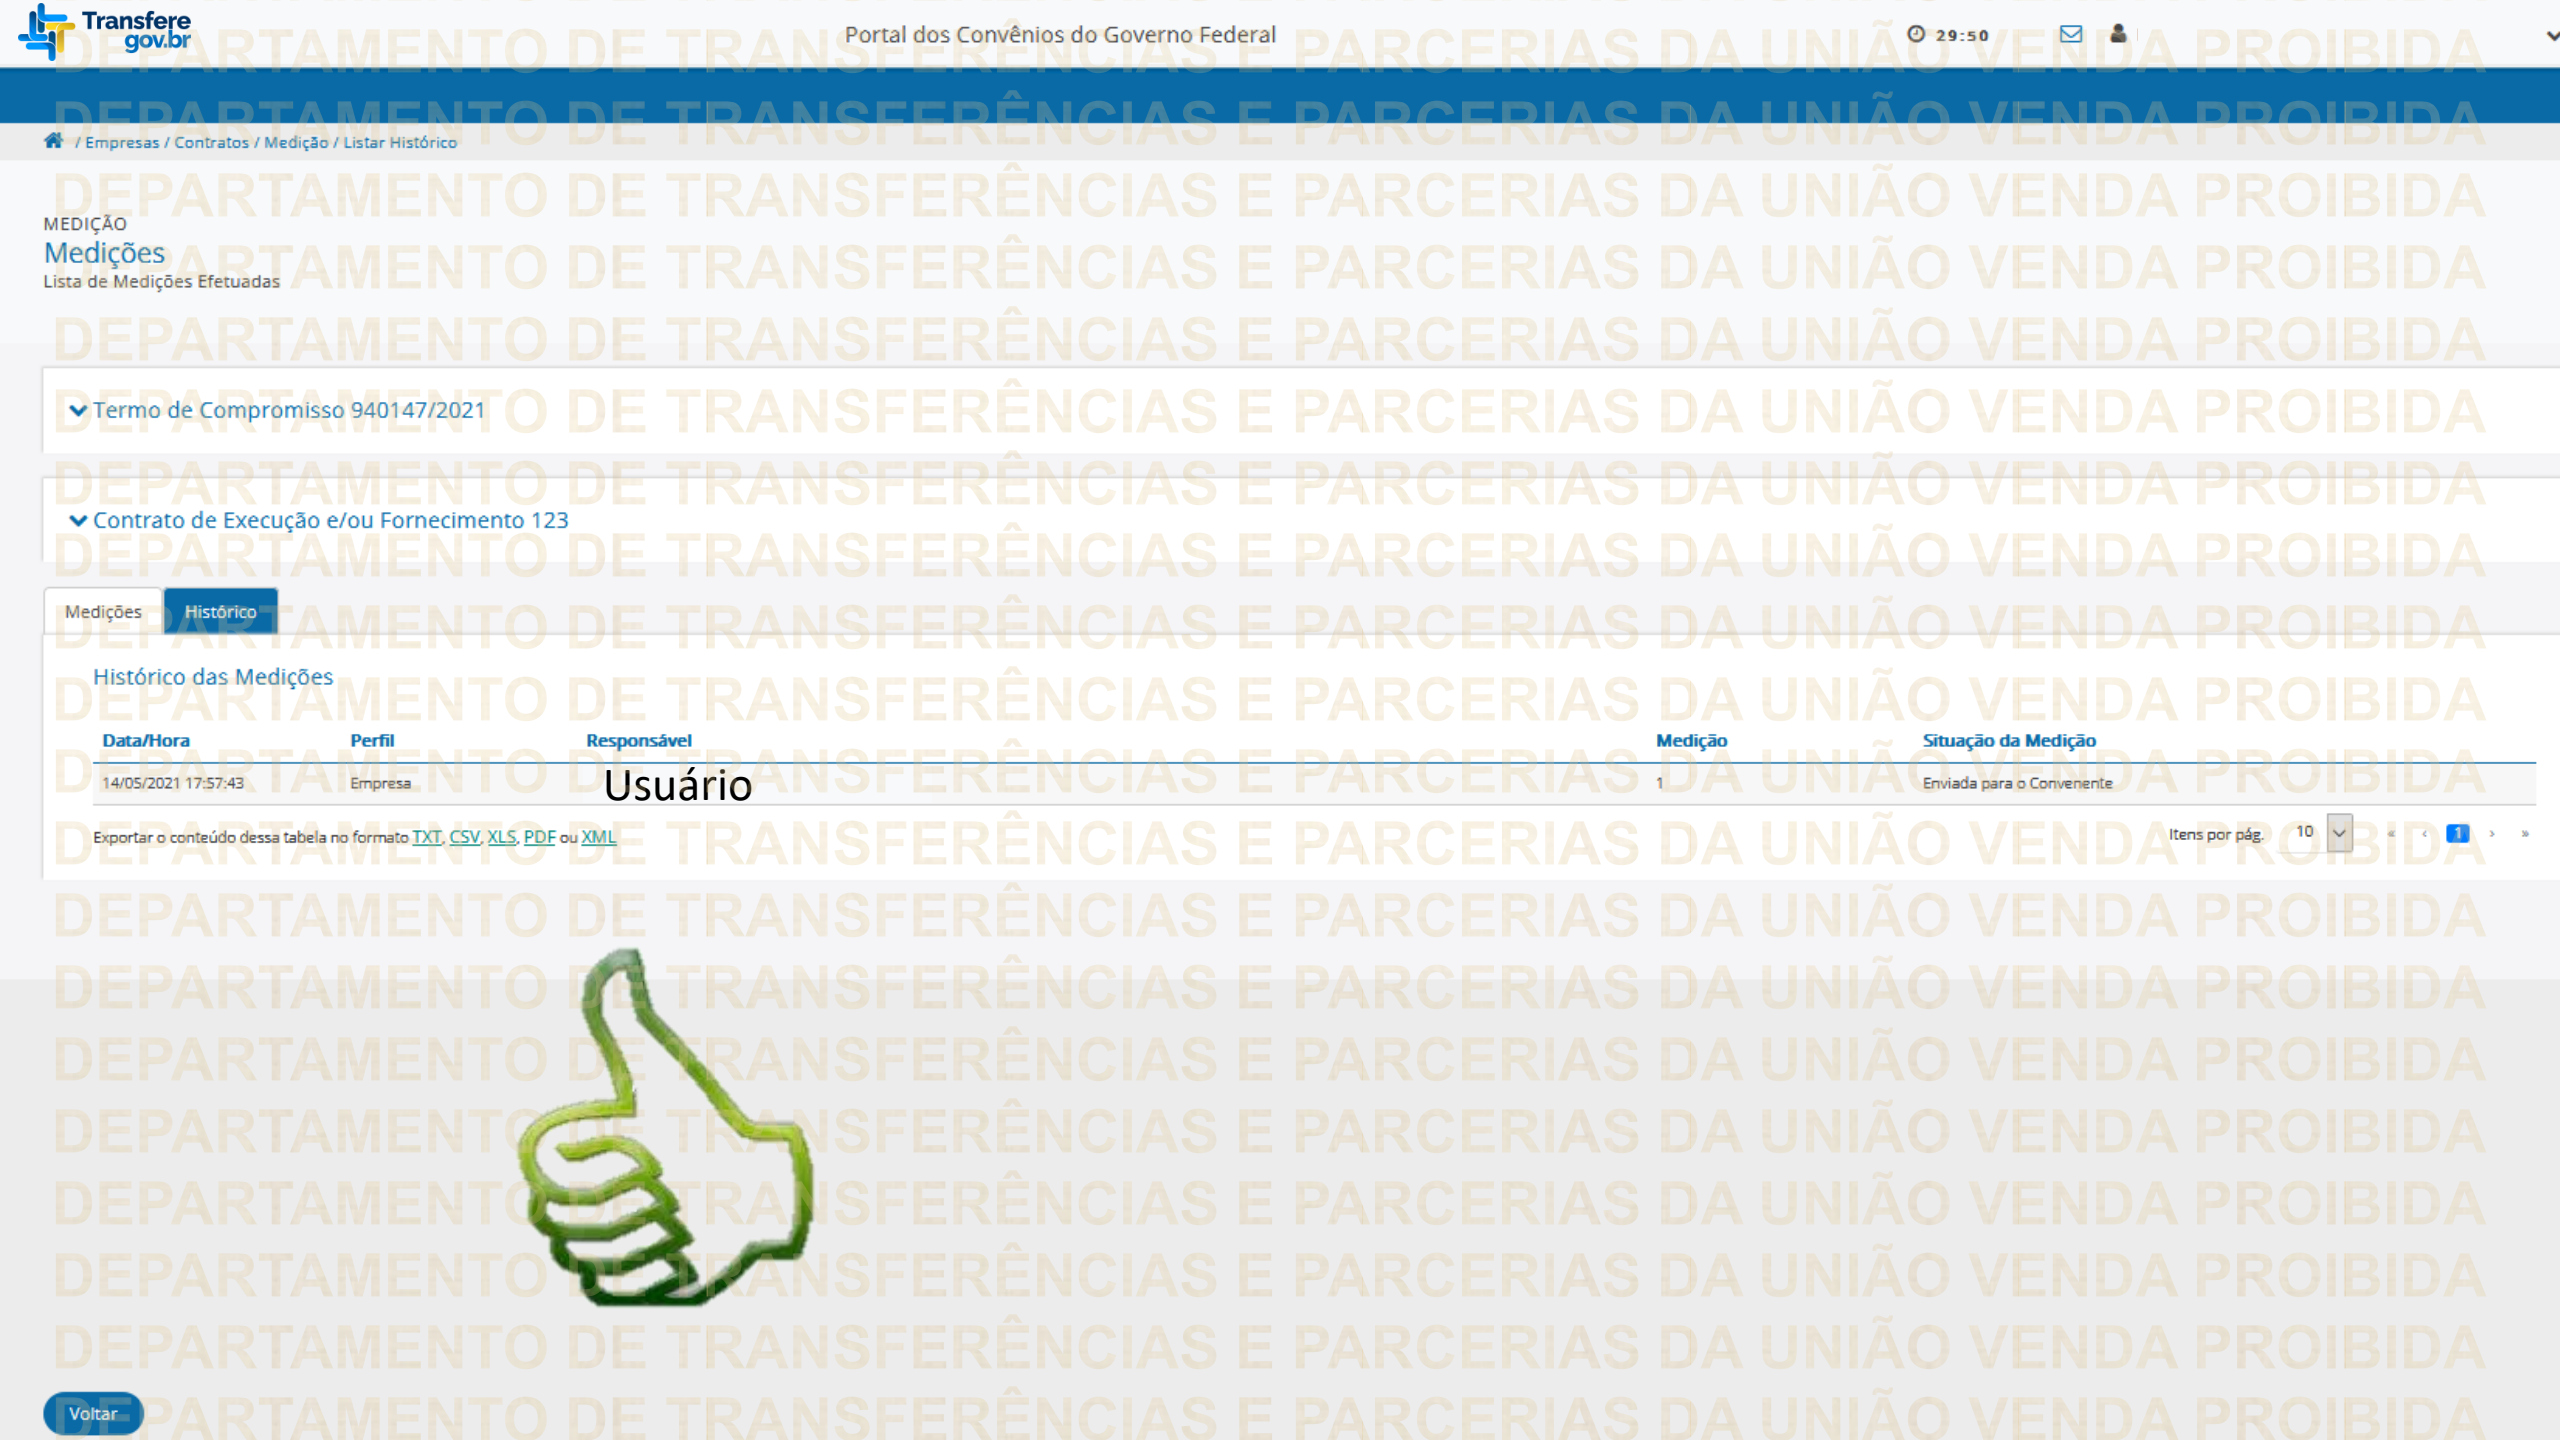

MEDIÇÃO
Medições
Lista de Medições Efetuadas

- ▼ Termo de Compromisso 940147/2021
- ▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições **Histórico**

Histórico das Medições

Data/Hora	Perfil	Responsável	Medição	Situação da Medição
14/05/2021 17:57:43	Empresa	Usuário	1	Enviada para o Conveniente

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#) Itens por pág. 10    



DÚVIDAS

- Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.
- Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas manifestações.
- **0800-978-9008** - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)
- <https://portaldeservicos.economia.gov.br>



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS
