



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	002/2026-APES-R01
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
Nº PROJETO:	PROJETO-DP-021-26 - (HOSPITAL DA REGIÃO OESTE)
NOME PROJETO:	ESTUDOS TÉCNICOS PARA MODELAGEM DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE - HRO E REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - HRC
ENDEREÇO:	HRO - QNN 27 ÁREA ESPECIAL D, CEILÂNDIA/DF HRC - QNM 27, ÁREA ESPECIAL 1, QNM 28, CEILÂNDIA/DF
PRAZO:	270 DIAS CORRIDOS
DATA DE CONCLUSÃO:	09/09/2026
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES - CREA 23785/D-DF
PROCESSO:	00112-00011777/2026-15
DATA BASE ORÇAMENTO	TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA SICRO - ABRIL DE 2026
SISOBRAS:	
OBSERVAÇÕES:	1 - A descrição completa das etapas, produtos, atividades principais e prazos devem ser verificados no documento sei nº 213473159 - Especificação Técnica n.º 2/2026 - NOVACAP/PRES/DP/NIN/APES. 2 - O valor estimado para contratação de empresa especializada para desenvolvimento de estudos técnicos destinados à modelagem e à análise comparativa das alternativas de implantação, contratação, financiamento, construção, requalificação, equipagem, operação e manutenção do HRO e do HRC, teve como base os documentos SEI nº 213473159 - Especificação Técnica n.º 2/2026 - NOVACAP/PRES/DP/NIN/APES e nº 213473070 - Estudo Técnico Preliminar - ETP - NOVACAP/PRES/DP/NIN/APES. 3 - Nas composições de serviços e respectivos custos unitários, estão inclusos todos os custos de: • Mão de obra: pessoal, transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social e os equipamentos de proteção individual necessários à segurança pessoal; • Equipamentos: operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo de informática e de escritório; • Materiais: todos os materiais necessários à execução dos respectivos serviços.
BDI UTILIZADOS:	29,21% (ENG. CONSULTIVA)
RESP. CAPA:	ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES - CREA 23785/D-DF

ESTIMATIVAS APES :

002.01/2026-APES: Orçamento	R\$	4.240.803,15
VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI.....	R\$	4.240.803,15

NOTAS:	*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra. *Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060
---------------	--

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
 CREA 23785/D-DF
 ART: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 MAT.: 973.113-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA : 002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

ENDEREÇO : HRO - QNN 27 ÁREA ESPECIAL D, CEILÂNDIA/DF
 HRC - QNM 27, ÁREA ESPECIAL 1, QNM 28, CEILÂNDIA/DF

29,21%

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	TOTAL (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$) COM BDI	% GLOBAL
01.00	P00 - APRESENTAÇÃO, SÚMULA, PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA DETALHADO, PEB E REUNIÃO.	40.004,61	51.689,46	1,22%
02.00	P01 - RELATÓRIO DE DEMANDA ASSISTENCIAL, REDE E SITUAÇÃO ATUAL.	111.771,62	144.418,71	3,41%
03.00	P02 - RELATÓRIO DE DUE DILIGENCE DOS ATIVOS.	86.714,19	112.042,32	2,64%
04.00	P03 - PROGRAMA DE NECESSIDADES.	111.771,62	144.418,71	3,41%
05.00	P04 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR.	882.110,62	1.139.764,11	26,88%
06.00	P05 - CADERNO DE DIRETRIZES E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS.	359.661,97	464.714,74	10,96%
07.00	P06 - PLANO ASSISTENCIAL E DE TRANSIÇÃO.	186.324,28	240.747,27	5,68%
08.00	P07 - CADERNO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS.	186.324,28	240.747,27	5,68%
09.00	P08 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E DIRETRIZES DE REMUNERAÇÃO.	184.098,87	237.871,85	5,61%
10.00	P09 - MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ANÁLISE FISCAL COMPARATIVA.	219.781,79	283.977,31	6,70%
11.00	P10 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E FISCAL - EVTE.	274.586,92	354.790,33	8,37%
12.00	P11 - DUE DILIGENCE JURÍDICA.	110.219,28	142.412,95	3,36%
13.00	P12 - RELATÓRIO JURÍDICO INSTITUCIONAL.	183.928,35	237.651,52	5,60%
14.00	P13 - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA ESTRUTURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SUBSEQUENTE.	183.928,35	237.651,52	5,60%
15.00	P14 - RELATÓRIOS MENSIS DE GERENCIAMENTO.	160.906,33	207.905,06	4,90%
TOTAL GERAL COM BDI			4.240.803,15	100,00%

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
 CREA 23785/D-DF
 ART: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 MAT.: 973.113-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

ENCARGOS TRABALHISTAS:

CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2026

B.D.I. : 0,00%

TAB. REF.: TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CCU - 01	P00 - APRESENTAÇÃO, SÚMULA, PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA DETALHADO, PEB E REUNIÃO.	SER.CG	UNID.			40.004,61
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,250000	43.157,77	10.789,44
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	0,250000	36.162,09	9.040,52
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	0,500000	26.667,96	13.333,98
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	0,250000	27.362,69	6.840,67
CCU - 02	P01 - RELATÓRIO DE DEMANDA ASSISTENCIAL, REDE E SITUAÇÃO ATUAL.	SER.CG	UNID.			111.771,62
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	26.667,96	26.667,96
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	1,000000	27.362,69	27.362,69
CCU - 03	P02 - RELATÓRIO DE DUE DILIGENCE DOS ATIVOS.	SER.CG	UNID.			86.714,19
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,250000	43.157,77	10.789,44
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	0,500000	36.162,09	18.081,04
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	0,500000	26.667,96	13.333,98
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	0,500000	27.362,69	13.681,34
CCA - 01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	SER.CG	M2	69.000,00	0,30	20.700,00
CCA - 02	SONDAGEM A PERCURSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO	SER.CG	M	108,000000	92,78	10.020,24
CCA - 03	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUIROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10KM	SER.CG	UNID.	1,000000	108,15	108,15
CCU - 04	P03 - PROGRAMA DE NECESSIDADES.	SER.CG	UNID.			111.771,62
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	26.667,96	26.667,96
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	1,000000	27.362,69	27.362,69
CCU - 05	P04 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR.	SER.CG	UNID.			882.110,62
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	2,000000	43.157,77	86.315,54
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	4,000000	36.162,09	144.648,36
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	8,000000	26.667,96	213.343,68
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	16,000000	27.362,69	437.803,04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

ENCARGOS TRABALHISTAS:

CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2026

B.D.I. : 0,00%

TAB. REF.: TAB. CONSULTORIA
SICRO 04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CCU - 06	P05 - CADERNO DE DIRETRIZES E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS.	SER.CG	UNID.			359.661,97
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	1,000000	43.157,77	43.157,77
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	2,000000	36.162,09	72.324,18
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	3,000000	26.667,96	80.003,88
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	6,000000	27.362,69	164.176,14
CCU - 07	P06 - PLANO ASSISTENCIAL E DE TRANSIÇÃO.	SER.CG	UNID.			186.324,28
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,000000	26.667,96	53.335,92
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,750000	27.362,69	75.247,39
CCU - 08	P07 - CADERNO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS.	SER.CG	UNID.			186.324,28
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,000000	26.667,96	53.335,92
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,750000	27.362,69	75.247,39
CCU - 09	P08 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E DIRETRIZES DE REMUNERAÇÃO.	SER.CG	UNID.			184.098,87
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,500000	26.667,96	40.001,94
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,500000	27.362,69	68.406,72
P8047	ECONOMISTA SÊNIOR	M.O	MÊS	1,000000	17.949,24	17.949,24
CCU - 10	P09 - MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ANÁLISE FISCAL COMPARATIVA.	SER.CG	UNID.			219.781,79
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,500000	36.162,09	54.243,13
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,000000	26.667,96	53.335,92
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,000000	27.362,69	54.725,38
P8047	ECONOMISTA SÊNIOR	M.O	MÊS	2,000000	17.949,24	35.898,48
CCU - 11	P10 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E FISCAL - EVTE.	SER.CG	UNID.			274.586,92
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,250000	36.162,09	45.202,61
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,000000	26.667,96	53.335,92
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,250000	27.362,69	61.566,05
P8047	ECONOMISTA SÊNIOR	M.O	MÊS	2,000000	17.949,24	35.898,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

ENCARGOS TRABALHISTAS:

CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2026

B.D.I. : 0,00%

TAB. REF.: TAB. CONSULTORIA
SICRO 04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
P8058	ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO	M.O	MÊS	2,000000	28.502,49	57.004,98
CCU - 12	P11 - DUE DILIGENCE JURÍDICA.	SER.CG	UNID.			110.219,28
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	0,500000	36.162,09	18.081,04
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	0,500000	26.667,96	13.333,98
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	0,500000	27.362,69	13.681,34
P8003	ADVOGADO SENIOR	M.O	MÊS	2,000000	21.772,02	43.544,04
CCU - 13	P12 - RELATÓRIO JURÍDICO INSTITUCIONAL.	SER.CG	UNID.			183.928,35
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	26.667,96	26.667,96
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	1,250000	27.362,69	34.203,36
P8003	ADVOGADO SENIOR	M.O	MÊS	3,000000	21.772,02	65.316,06
CCU - 14	P13 - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA ESTRUTURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SUBSEQUENTE.	SER.CG	UNID.			183.928,35
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	26.667,96	26.667,96
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	1,250000	27.362,69	34.203,36
P8003	ADVOGADO SENIOR	M.O	MÊS	3,000000	21.772,02	65.316,06
CCU - 15	P14 - RELATÓRIOS MENSIS DE GERENCIAMENTO.	SER.CG	UNID.			160.906,33
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,500000	43.157,77	21.578,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	36.162,09	36.162,09
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	26.667,96	26.667,96
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	2,000000	27.362,69	54.725,38
P8003	ADVOGADO SENIOR	M.O	MÊS	1,000000	21.772,02	21.772,02

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES

CREA 23785/D-DF

ART: XXXXXXXXXXXXXXXXX

MAT.: 973.113-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE CUSTOS

Nº ESTIMATIVA

PRINCIPAL:

002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

ENCARGOS
TRABALHISTAS:

CONFORME SINAPI 04/2026

B.D.I. : 0,00%

TAB. REF.: SINAPI 04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CCA - 01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	SER.CG	M2			0,30
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,005500	18,42	0,10
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,001000	24,96	0,02
6443-ORSE	TEODOLITO	EQUIP.	H	0,002700	2,48	0,00
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,002000	44,63	0,08
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,002700	31,29	0,08
4415-ORSE	VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL OU SIMILAR	EQUIP.	H	0,001600	13,18	0,02
REFERÊNCIA: 9346 ORSE 04/2026						
CCA - 02	SONDAGEM A PERCURSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO	SER.CG	M			92,78
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,133000	24,96	3,31
9900003U	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	EQUIP.	H	1,000000	21,60	21,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,533000	25,11	13,38
100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,375000	26,54	9,95
88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,066000	41,79	44,54
REFERÊNCIA: 01.02.02U COMPESA (PE) 07/2024						
CCA - 03	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10KM	SER.CG	UN			108,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,000000	25,11	50,22
88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,000000	41,79	41,79
SICRO3/E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO	EQUIP.	CHP	0,166670	96,87	16,14
REFERÊNCIA: 01.02.03U COMPESA (PE) 07/2024						

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES

CREA 23785/D-DF

ART: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

MAT.: 973.113-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026


TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2026

B.D.I.: 29,21% (Consultoria)

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	% GLOBAL	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210	DIAS 211 A 240	DIAS 241 A 270
01.00	P00 - APRESENTAÇÃO, SÚMULA, PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA DETALHADO, PEB E REUNIÃO.	51.689,46	1,22%	100,00%								
				51.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00	P01 - RELATÓRIO DE DEMANDA ASSISTENCIAL, REDE E SITUAÇÃO ATUAL.	144.418,71	3,41%			100,00%						
				0,00	0,00	144.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	P02 - RELATÓRIO DE DUE DILIGENCE DOS ATIVOS.	112.042,32	2,64%			100,00%						
				0,00	0,00	112.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	P03 - PROGRAMA DE NECESSIDADES.	144.418,71	3,41%				100,00%					
				0,00	0,00	0,00	144.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	P04 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR.	1.139.764,11	26,88%						100,00%			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.764,11	0,00	0,00	0,00
06.00	P05 - CADERNO DE DIRETRIZES E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS.	464.714,74	10,96%							100,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.714,74	0,00	0,00
07.00	P06 - PLANO ASSISTENCIAL E DE TRANSIÇÃO.	240.747,27	5,68%			100,00%						
				0,00	0,00	240.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	P07 - CADERNO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS.	240.747,27	5,68%							100,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.747,27	0,00	0,00
09.00	P08 - RELATÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E DIRETRIZES DE REMUNERAÇÃO.	237.871,85	5,61%								100,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.871,85	0,00
10.00	P09 - MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ANÁLISE FISCAL COMPARATIVA.	283.977,31	6,70%									100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.977,31
11.00	P10 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E FISCAL - EVTE.	354.790,33	8,37%									100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.790,33
12.00	P11 - DUE DILIGENCE JURÍDICA.	142.412,95	3,36%			100,00%						
				0,00	0,00	142.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00	P12 - RELATÓRIO JURÍDICO INSTITUCIONAL.	237.651,52	5,60%							100,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.651,52	0,00	0,00
14.00	P13 - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA ESTRUTURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SUBSEQUENTE.	237.651,52	5,60%									100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.651,52
15.00	P14 - RELATÓRIOS MENSIS DE GERENCIAMENTO.	207.905,06	4,90%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
				23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56	23.100,56
	PERCENTUAL MENSAL (%)			1,76%	0,54%	15,63%	3,95%	0,54%	27,42%	22,78%	6,15%	21,21%
	VALOR MENSAL (R\$)			74.790,02	23.100,56	662.721,83	167.519,28	23.100,56	1.162.864,67	966.214,10	260.972,41	899.519,72
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			1,76%	2,31%	17,94%	21,89%	22,43%	49,85%	72,64%	78,79%	100,00%
	VALOR ACUMULADO (R\$)			74.790,02	97.890,58	760.612,41	928.131,68	951.232,25	2.114.096,92	3.080.311,02	3.341.283,43	4.240.803,15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA "S"

Nº ESTIMATIVA : 002/2026-APES-R01


DATA: 09/09/2026


NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

ENDEREÇO : HRO - QNN 27 ÁREA ESPECIAL D, CEILÂNDIA/DF
HRC - QNM 27, ÁREA ESPECIAL 1, QNM 28, CEILÂNDIA/DF

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

CURVA S DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

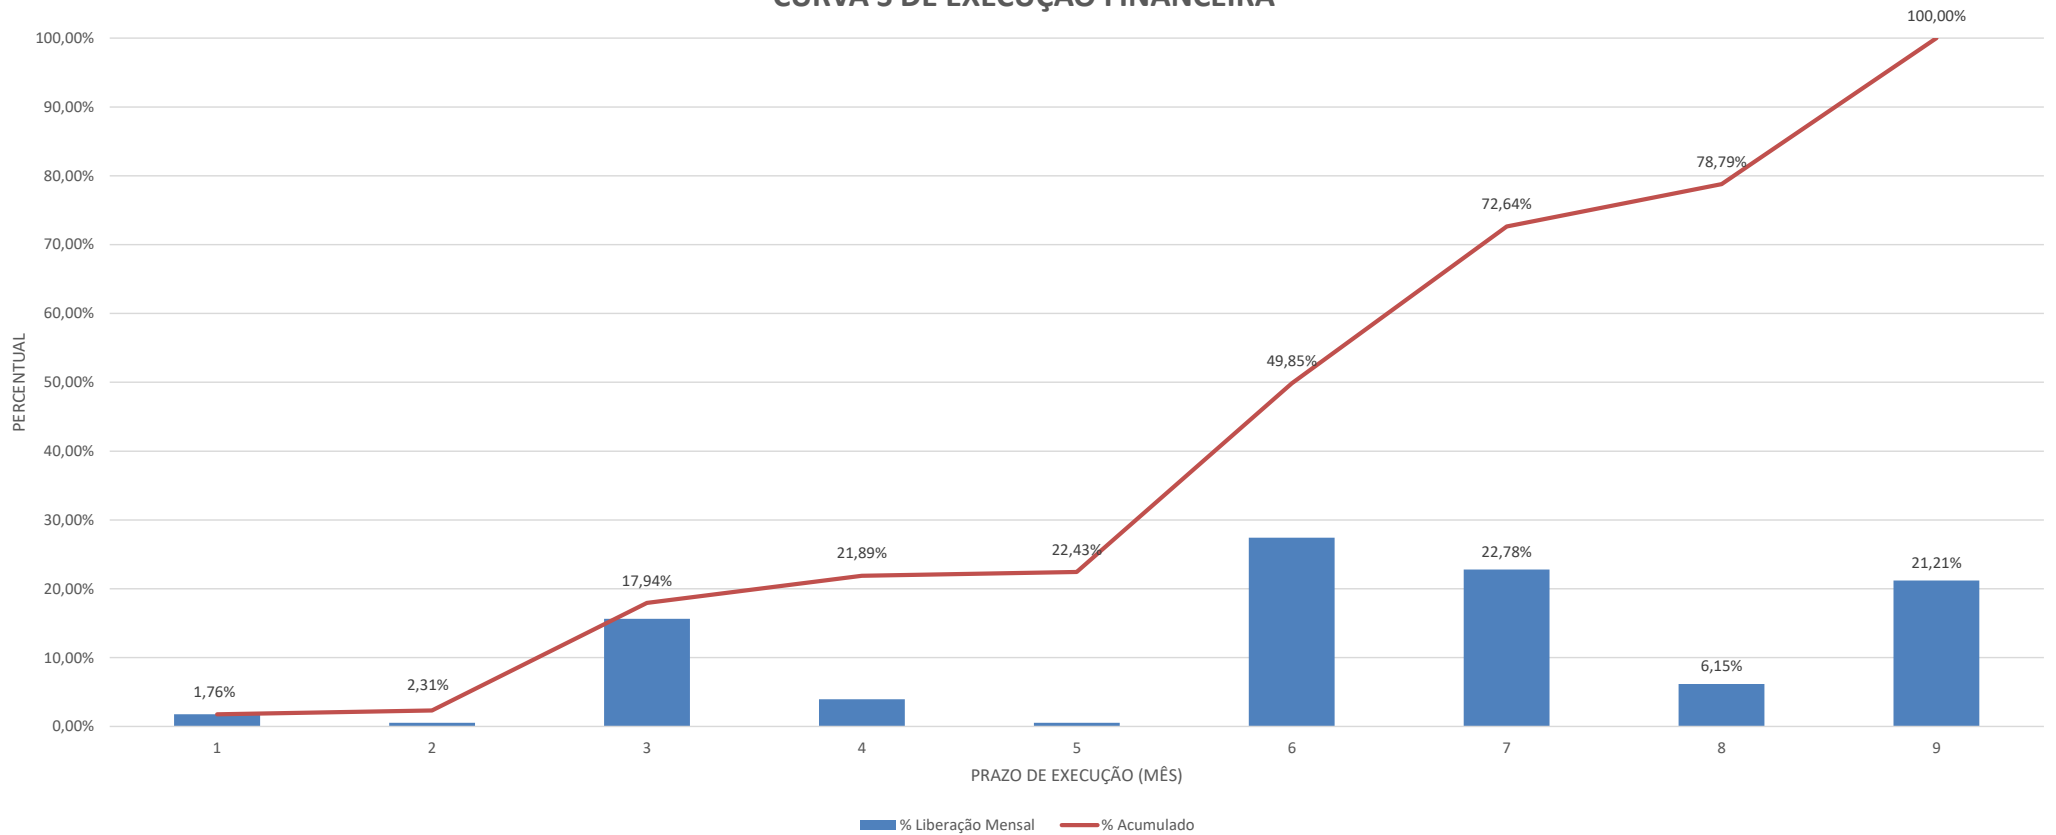



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA "S"

Nº ESTIMATIVA : 002/2026-APES-R01

DATA: 09/09/2026

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE FINANCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO OESTE – HRO E À REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC, AMBOS NA REGIÃO OESTE DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

ENDEREÇO : HRO - QNN 27 ÁREA ESPECIAL D, CEILÂNDIA/DF
HRC - QNM 27, ÁREA ESPECIAL 1, QNM 28, CEILÂNDIA/DF

Nº PROJETO: PROJ-DP-021-26

CURVA S DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES

CREA 23785/D-DF

ART: XXXXXXXXXXXXXXXXX

MAT.: 973.113-X



EXEMPLO
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,00%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		5,36%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	6,08%
	PIS - Programa de Integração Social	1,32%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		12,40%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		29,21%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2026

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
						R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
P8001	Advogado júnior	mês	5.021,60	75,53	3.792,81	15,46	776,57	0,53	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,47	0,00	0,00	7,33	368,29	0,20	9,98	99,15	4.978,90	10.000,49
P8002	Advogado pleno	mês	6.695,46	75,53	5.057,08	11,60	776,57	0,40	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,47	0,00	0,00	5,50	368,29	0,15	9,98	93,24	6.243,17	12.938,63
P8003	Advogado sênior	mês	11.727,87	75,53	8.858,06	6,62	776,57	0,23	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,47	0,00	0,00	3,14	368,29	0,09	9,98	85,64	10.044,15	21.772,02
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.300,72	75,46	3.245,33	18,06	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,79	0,11	4,74	0,00	0,00	8,56	368,29	0,23	9,98	102,56	4.410,70	8.711,42
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.734,30	75,46	4.327,10	13,54	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,74	0,00	0,00	6,42	368,29	0,17	9,98	95,68	5.486,68	11.220,98
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.254,63	75,46	7.738,15	7,57	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,74	0,00	0,00	3,59	368,29	0,10	9,98	86,77	8.897,73	19.152,36
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.443,57	75,45	9.388,67	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,60	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08	9,98	84,98	10.574,89	23.018,46
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.523,65	75,45	10.958,10	5,35	776,57	0,18	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,60	0,00	0,00	2,54	368,29	0,07	9,98	83,62	12.144,31	26.667,96
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.603,73	75,45	12.527,52	4,68	776,57	0,16	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,60	0,00	0,00	2,22	368,29	0,06	9,98	82,59	13.713,73	30.317,47
P8019	Assistente social júnior	mês	3.278,98	76,04	2.493,34	23,68	776,57	0,82	26,77	0,00	0,00	2,05	67,10	0,22	7,22	0,00	0,00	11,23	368,29	0,30	9,98	114,34	3.749,26	7.028,24
P8020	Assistente social pleno	mês	4.371,97	76,04	3.324,45	17,76	776,57	0,61	26,77	0,00	0,00	0,03	1,52	0,17	7,22	0,00	0,00	8,42	368,29	0,23	9,98	103,27	4.514,79	8.886,76
P8021	Assistente social sênior	mês	7.412,23	76,04	5.636,26	10,48	776,57	0,36	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7,22	0,00	0,00	4,97	368,29	0,13	9,98	92,08	6.825,09	14.237,32
P8025	Auxiliar	mês	1.786,75	76,18	1.361,14	43,46	776,57	1,82	32,60	0,09	1,67	8,77	156,63	0,43	7,68	0,00	0,00	20,61	368,29	0,56	9,98	151,93	2.714,56	4.501,30
P8026	Auxiliar administrativo	mês	2.062,16	75,79	1.562,91	37,66	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	140,10	0,28	5,72	0,00	0,00	17,86	368,29	0,48	9,98	138,86	2.863,58	4.925,74
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.983,20	75,74	1.502,08	39,16	776,57	1,64	32,60	0,17	3,44	7,30	144,84	0,28	5,63	0,00	0,00	18,57	368,29	0,50	9,98	143,38	2.843,43	4.826,63
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.786,75	75,80	1.354,35	43,46	776,57	1,82	32,60	0,08	1,45	8,77	156,63	0,35	6,18	0,00	0,00	20,61	368,29	0,56	9,98	151,45	2.706,05	4.492,80
P8032	Biólogo júnior	mês	3.210,11	75,51	2.423,95	24,19	776,57	0,83	26,77	0,00	0,00	2,22	71,23	0,17	5,32	0,00	0,00	11,47	368,29	0,31	9,98	114,70	3.682,11	6.892,22
P8033	Biólogo pleno	mês	4.280,14	75,51	3.231,93	18,14	776,57	0,63	26,77	0,00	0,00	0,16	7,03	0,12	5,32	0,00	0,00	8,60	368,29	0,23	9,98	103,41	4.425,89	8.706,03
P8034	Biólogo sênior	mês	7.754,20	75,51	5.855,20	10,01	776,57	0,35	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,32	0,00	0,00	4,75	368,29	0,13	9,98	90,82	7.042,13	14.796,33
P8038	Chefe de escritório	mês	4.337,40	75,18	3.260,86	17,90	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,59	0,09	3,96	0,00	0,00	8,49	368,29	0,23	9,98	101,98	4.423,25	8.760,65
P8040	Contador júnior	mês	4.573,52	75,39	3.447,98	16,98	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	4,88	0,00	0,00	8,05	368,29	0,22	9,98	100,75	4.607,70	9.181,22
P8041	Contador pleno	mês	6.098,03	75,39	4.597,31	12,73	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,88	0,00	0,00	6,04	368,29	0,16	9,98	94,41	5.757,02	11.855,05
P8042	Contador sênior	mês	11.552,80	75,39	8.709,66	6,72	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,88	0,00	0,00	3,19	368,29	0,09	9,98	85,43	9.869,37	21.422,18
P8044	Coordenador ambiental	mês	23.874,03	75,50	18.024,89	3,25	776,57	0,10	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,47	0,00	0,00	1,54	368,29	0,04	9,98	80,46	19.208,65	43.082,68
P8045	Economista júnior	mês	4.789,97	75,13	3.598,70	16,21	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	5,09	0,00	0,00	7,69	368,29	0,21	9,98	99,35	4.758,63	9.548,60
P8046	Economista pleno	mês	6.386,63	75,13	4.798,27	12,16	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,09	0,00	0,00	5,77	368,29	0,16	9,98	93,29	5.958,20	12.344,82
P8047	Economista sênior	mês	9.586,77	75,13	7.202,54	8,10	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,09	0,00	0,00	3,84	368,29	0,10	9,98	87,23	8.362,47	17.949,24
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.443,57	75,09	9.343,88	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,45	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08	9,98	84,61	10.528,94	22.972,50
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	14.840,74	75,09	11.143,91	5,23	776,57	0,18	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,45	0,00	0,00	2,48	368,29	0,07	9,98	83,08	12.328,97	27.169,72
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	17.237,92	75,09	12.943,95	4,50	776,57	0,16	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,45	0,00	0,00	2,14	368,29	0,06	9,98	81,96	14.129,01	31.366,93
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.443,57	75,54	9.399,87	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,65	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08	9,98	85,07	10.586,13	23.029,70
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	15.561,26	75,54	11.754,97	4,99	776,57	0,17	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,65	0,00	0,00	2,37	368,29	0,06	9,98	83,16	12.941,23	28.502,49
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	18.678,94	75,54	14.110,07	4,16	776,57	0,14	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,65	0,00	0,00	1,97	368,29	0,05	9,98	81,89	15.296,33	33.975,27
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.933,22	75,38	18.040,86	3,24	776,57	0,10	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,40	0,00	0,00	1,54	368,29	0,04	9,98	80,33	19.224,55	43.157,77
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.944,35	75,38	15.034,05	3,89	776,57	0,12	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,40	0,00	0,00	1,85	368,29	0,05	9,98	81,32	16.217,74	36.162,09
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.443,57	76,10	9.469,56	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,92	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08	9,98	85,64	10.657,09	23.100,66
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.677,54	76,10	11.169,61	5,29	776,57	0,18	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,92	0,00	0,00	2,51	368,29	0,07	9,98	84,19	12.357,14	27.034,68
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.911,51	76,10	12.869,66	4,59	776,57	0,16	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,92	0,00	0,00	2,18	368,29	0,06	9,98	83,12	14.057,19	30.968,71
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.443,57	75,38	9.379,96	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,40	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08				

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2026

P8108	Meteorologista sênior	mês	12.176,14	75,48	9.190,55	6,38	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,93	0,00	0,00	3,02	368,29	0,08	9,98	85,22	10.377,09	22.553,23
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.674,02	75,80	2.026,91	29,04	776,57	1,22	32,60	0,00	0,00	3,87	103,39	0,23	6,26	0,00	0,00	13,77	368,29	0,37	9,98	124,31	3.324,00	5.998,01
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.312,65	75,43	1.744,43	33,58	776,57	1,41	32,60	0,00	0,00	5,41	125,07	0,20	4,61	0,00	0,00	15,93	368,29	0,43	9,98	132,38	3.061,55	5.374,21
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.946,56	76,04	3.761,36	15,70	776,57	0,54	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	7,15	0,00	0,00	7,45	368,29	0,20	9,98	100,07	4.950,13	9.896,68
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.595,41	76,04	5.015,15	11,77	776,57	0,41	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	7,15	0,00	0,00	5,58	368,29	0,15	9,98	94,06	6.203,91	12.799,32
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	12.511,63	76,04	9.513,84	6,21	776,57	0,21	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	7,15	0,00	0,00	2,94	368,29	0,08	9,98	85,54	10.702,61	23.214,24
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.374,04	76,03	1.804,98	32,71	776,57	1,13	26,77	0,00	0,00	5,11	121,39	0,27	6,30	0,00	0,00	15,51	368,29	0,42	9,98	131,18	3.114,29	5.488,33
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.165,39	76,03	2.406,64	24,53	776,57	0,85	26,77	0,00	0,00	2,33	73,91	0,20	6,30	0,00	0,00	11,63	368,29	0,32	9,98	115,89	3.668,47	6.833,86
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.103,05	76,03	3.119,55	18,93	776,57	0,65	26,77	0,00	0,00	0,43	17,65	0,15	6,30	0,00	0,00	8,98	368,29	0,24	9,98	105,41	4.325,12	8.428,17
P8135	Secretária	mês	3.095,21	76,03	2.353,29	25,09	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	78,12	0,22	6,86	0,00	0,00	11,90	368,29	0,32	9,98	116,09	3.593,11	6.688,32
P8139	Sondador	mês	2.352,85	75,51	1.776,63	33,01	776,57	1,28	30,02	0,00	0,00	5,21	122,66	0,24	5,71	0,00	0,00	15,65	368,29	0,42	9,98	131,32	3.089,86	5.442,71
P8143	Técnico ambiental	mês	3.166,98	76,02	2.407,54	24,52	776,57	0,95	30,02	0,00	0,00	2,33	73,82	0,18	5,69	0,00	0,00	11,63	368,29	0,32	9,98	115,94	3.671,90	6.838,88
P8147	Técnico de obras	mês	3.435,51	76,02	2.611,67	22,60	776,57	0,87	30,02	0,00	0,00	1,68	57,70	0,20	6,89	0,00	0,00	10,72	368,29	0,29	9,98	112,39	3.861,13	7.296,64
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	76,17	3.505,21	16,88	776,57	0,65	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,01	0,00	0,00	8,00	368,29	0,22	9,98	102,07	4.697,08	9.298,91
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	3.075,29	75,37	2.317,84	25,25	776,57	0,98	30,02	0,00	0,00	2,58	79,32	0,15	4,47	0,00	0,00	11,98	368,29	0,32	9,98	116,62	3.586,48	6.661,77
P8163	Topógrafo	mês	2.733,10	75,80	2.071,69	28,41	776,57	1,10	30,02	0,00	0,00	3,65	99,85	0,23	6,18	0,00	0,00	13,48	368,29	0,37	9,98	123,03	3.362,58	6.095,68
P8167	Arquivista júnior	mês	2.897,16	76,03	2.202,71	26,80	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	90,00	0,22	6,39	0,00	0,00	12,71	368,29	0,34	9,98	119,22	3.453,94	6.351,10
P8168	Arquivista pleno	mês	3.862,88	76,03	2.936,95	20,10	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	32,06	0,17	6,39	0,00	0,00	9,53	368,29	0,26	9,98	106,92	4.130,23	7.993,11
P8169	Arquivista sênior	mês	6.211,44	76,03	4.722,55	12,50	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,39	0,00	0,00	5,93	368,29	0,16	9,98	94,72	5.883,78	12.095,21
P8173	Administrador júnior	mês	3.748,45	75,51	2.830,46	20,72	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	38,93	0,12	4,38	0,00	0,00	9,83	368,29	0,27	9,98	107,47	4.028,60	7.777,05
P8174	Administrador pleno	mês	4.997,94	75,51	3.773,94	15,54	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,38	0,00	0,00	7,37	368,29	0,20	9,98	98,70	4.933,16	9.931,09
P8175	Administrador sênior	mês	9.000,38	75,51	6.796,18	8,63	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,38	0,00	0,00	4,09	368,29	0,11	9,98	88,39	7.955,40	16.955,78
P8178	Designer gráfico	mês	3.148,89	75,52	2.378,04	24,66	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	74,90	0,14	4,47	0,00	0,00	11,70	368,29	0,32	9,98	114,72	3.612,25	6.761,14
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.443,57	75,15	9.351,34	6,24	776,57	0,22	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,50	0,00	0,00	2,96	368,29	0,08	9,98	84,68	10.537,45	22.981,02
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	14.879,13	75,15	11.181,66	5,22	776,57	0,18	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,50	0,00	0,00	2,48	368,29	0,07	9,98	83,12	12.367,78	27.246,90
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	17.314,69	75,15	13.011,99	4,49	776,57	0,15	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,50	0,00	0,00	2,13	368,29	0,06	9,98	82,00	14.198,10	31.512,79
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.231,61	75,42	3.191,48	18,35	776,57	0,63	26,77	0,00	0,00	0,23	9,94	0,12	5,09	0,00	0,00	8,70	368,29	0,24	9,98	103,70	4.388,12	8.619,73
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.642,15	75,42	4.255,31	13,76	776,57	0,47	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,09	0,00	0,00	6,53	368,29	0,18	9,98	96,45	5.442,01	11.084,16
P8185	Geógrafo sênior	mês	11.036,33	75,42	8.323,60	7,04	776,57	0,24	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,09	0,00	0,00	3,34	368,29	0,09	9,98	86,17	9.510,30	20.546,63
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.668,08	76,09	2.791,04	21,17	776,57	0,73	26,77	0,00	0,00	1,19	43,75	0,18	6,59	0,00	0,00	10,04	368,29	0,27	9,98	109,68	4.023,00	7.691,08
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.890,77	76,09	3.721,39	15,88	776,57	0,55	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,59	0,00	0,00	7,53	368,29	0,20	9,98	100,38	4.909,60	9.800,37
P8188	Antropólogo sênior	mês	8.135,18	76,09	6.190,06	9,55	776,57	0,33	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6,59	0,00	0,00	4,53	368,29	0,12	9,98	90,70	7.378,26	15.513,44
P8189	Arqueólogo júnior	mês	3.174,03	75,77	2.404,96	24,47	776,57	0,84	26,77	0,00	0,00	2,31	73,39	0,18	5,85	0,00	0,00	11,60	368,29	0,31	9,98	115,49	3.665,81	6.839,83
P8190	Arqueólogo pleno	mês	4.232,03	75,77	3.206,61	18,35	776,57	0,63	26,77	0,00	0,00	0,23	9,91	0,14	5,85	0,00	0,00	8,70	368,29	0,24	9,98	104,06	4.403,98	8.636,02
P8191	Arqueólogo sênior	mês	6.543,04	75,77	4.957,66	11,87	776,57	0,41	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	5,85	0,00	0,00	5,63	368,29	0,15	9,98	93,92	6.145,12	12.688,16
P8192	Historiador júnior	mês	4.666,95	80,81	3.771,36	16,64	776,57	0,57	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	12,70	0,00	0,00	7,89	368,29	0,21	9,98	106,40	4.965,68	9.632,63
P8193	Historiador pleno	mês	6.222,60	80,81	5.028,49	12,48	776,57	0,43	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	12,70	0,00	0,00	5,92	368,29	0,16	9,98	100,00	6.222,80	12.445,40
P8194	Historiador sênior	mês	10.549,66	80,81	8.525,18	7,36	776,57	0,25	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,70	0,00	0,00	3,49	368,29	0,09	9,98	92,13	9.719,49	20.269,15
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.668,08	76,09	2.791,04	21,17	776,57	0,73	26,77	0,00	0,00	1,19	43,75	0,18	6,59	0,00	0,00	10,04	368,29	0,27	9,98	109,68	4.023,00	7.691,08
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.890,77	76,09	3.721,39	15,88	776,57	0,55	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,59	0,00	0,00	7,53	368,29	0,20	9,98	100,38	4.909,60	9.800,37
P8197	Paleontólogo sênior	mês	8.135,18	76,09	6.190,06	9,55	776,57	0,33	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6,59	0,00	0,00	4,53	368,29	0,12	9,98	90,70	7.378,26	15.513,44
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.718,21	81,13	3.827,89	16,46	776,57	0,57	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	13,14	0,00	0,00	7,81	368,29	0,21	9,98	106,45	5.022,64	9.740,85
P8199	Sociólogo pleno	mês	6.290,95	81,13	5.103,85	12,34	776,57	0,43	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	13,14	0,00	0,00	5,85	368,29	0,16	9,98	100,12	6.298,60	12.589,55
P8200	Sociólogo sênior	mês	10.455,99	81,13	8.482,94	7,43	776,57	0,26	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	13,14	0,00	0,00	3,52	368,29	0,10	9,98	92,56	9.677,70	20.133,68
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,51	109,23	11,48	40,48	4,26	1,70	0,18	0,00	0,00	6,52	0,69	0,24	0,03	0,00	0,00	19,20	2,02	0,52	0,05	177,89	18,70	29,21
